


北京市生产建设项目水土保持设施验收表

一、项目概况				
项目名称	东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程			
项目位置	位于通州区六环路以西，呈南北走向南起现况张采路，与现况东六环西侧路南段相接，北至土桥中街，与现况东六环西侧路北段相接。			
项目投资	4927（万元）	征占地面积	7.65（公顷）	
建设规模	道路设计长度为 1.4km（本工程实施长度约 972m，其余约 420m 随东六环改造工程立项并实施），道路等级为城市主干路，红线宽 55m。本项目工程包括道路工程、交通工程、雨水工程、照明工程、绿化工程等。			
开工时间	2023 年 12 月	完工时间	2025 年 7 月	
水土保持方案批复文号及时间	通水评备【2023】第 75 号 2023 年 9 月 18 日			
建设单位	北京市首发高速公路建设管理有限责任公司			
统一社会信用代码	9111011280242258XX	法定代表人	孙波	
联系人	刘钧壬	联系电话	17600825000	
通讯地址	北京市丰台区卢沟桥路 102 号			
电子邮箱	455276870@qq.com	传 真	/	
二、水土保持技术指标				
防治责任范围面积	7.65（公顷）			
土石方挖填及综合利用情况	项目实际土石方挖填总量 4176m³，其中挖方 375m³，填方 3801m³，借方 3426m³，借方来源为东六环路（京哈高速~潞苑北大街）改造工程（此工程与本项目为同一建设单位及施工单位），无余方。			
新增水土流失量	47.77（吨）	减少水土流失量	33.03（吨）	
水土流失防治目标	评估指标	目标值	达标情况	
	水土流失治理度(%)	95	$\frac{\text{水土流失治理达标面积}}{\text{水土流失总面积}} = \frac{7.63 \text{ hm}^2}{7.65 \text{ hm}^2} = 99.49\%$ ，达标	
	土壤流失控制比	1.0	$\frac{\text{容许土壤流失量}}{\text{治理后平均土壤流失量}} = \frac{200 \text{ t/km}^2 \cdot \text{a}}{180 \text{ t/km}^2 \cdot \text{a}} = 1.11$ ，达标	
	渣土防护率(%)	98	$\frac{\text{挡护的永久弃渣、临时堆土数量}}{\text{永久弃渣、临时堆土总量}} = \frac{3800\text{m}^3}{3801\text{m}^3} = 99\%$ ，达标	

	表土保护率 (%)	不涉及	本项目不涉及	
	林草植被恢复率 (%)	97	$\frac{\text{林草类植被面积}}{\text{可恢复林草植被面积}} = \frac{3.10\text{hm}^2}{3.12\text{hm}^2} = 99.36\%$, 达标	
	林草覆盖率 (%)	25	$\frac{\text{林草类植被面积}}{\text{总面积}} = \frac{3.10\text{hm}^2}{7.65\text{hm}^2} = 40.52\%$, 达标	
工程措施及其措施量		道路工程防治区: 透水铺装 0.81hm ² , 整理绿化用地 0.45hm ² 。		投资 185.31 万元
植物措施及其措施量		道路工程防治区: 绿化隔离带 0.45hm ² , 边坡绿化 2.67hm ² 。		投资 111.66 万元
临时措施及其措施量		道路工程防治区: 苫盖密目网 11.50hm ² , 洒水降尘 520 台时, 临时排水沟 500m, 临时沉沙池 2 座; 施工生产生活区: 苫盖密目网 0.70hm ² , 临时排水沟 500m, 临时沉沙池 2 座。		投资 91.11 万元
水土保持补偿费缴纳情况		不涉及		水土保持总投资 388.08 万元
水土保持监测单位		/	联系人及联系电话	/
水土保持设施管护单位		北京市首发天人生态景观有限公司	联系人及联系电话	李号 15931242154
验收材料公示网址及公示时间				
水土保持设施验收结论	我单位已于 2025 年 08 月 14 日组织该项目水土保持设施验收, 该项目符合水土保持设施验收标准和条件, 同意该项目水土保持设施通过验收, 水土保持设施明细清单见下表。如我单位存在谎报、瞒报、弄虚作假等问题, 愿承担相应的法律责任。  建设单位 (公章) 2025 年 8 月 14 日			
验收专家意见及签字	  2025 年 8 月 14 日			

水土保持设施明细清单

项目名称	东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程				
建设单位	北京市首发高速公路建设管理有限责任公司				
开工时间	2023 年 12 月		竣工时间	2025 年 7 月	
占地面积 (hm ²)	7.65	建筑面积 (m ²)	地上	/	
			地下	/	
主要水土保持设施					
工程设施	集雨池	容积 (m ³)	座数	汇水面积	材质
		/	/	/	/
	透水砖铺装面积 (m ²)		8066		
	嵌草砖铺装面积 (m ²)		/		
	下凹式绿地面积 (m ²)		/		
	截水沟(m)		/		
	排水沟(m)		/		
	挡土墙(m)		/		
	护坡 (m ²)		26669		
	植物措施	绿化面积 (hm ²)		3.12	
种植乔木 (株)		652			
种植灌木 (m ²)		3478			
播撒草籽 (hm ²)		1000			
其他植物措施		/			
其他水土保持设施		/			
附水土保持设施实景照片					

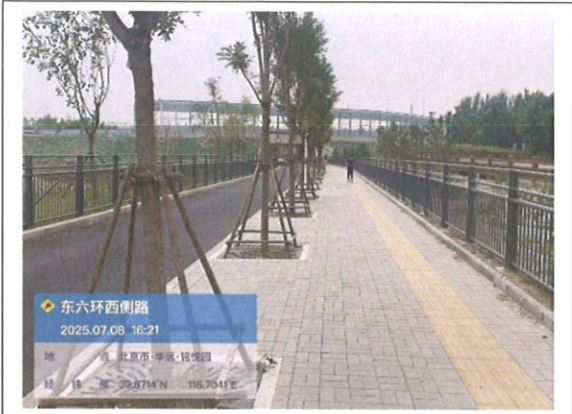

透水铺装和绿化



透水铺装和绿化



透水铺装和绿化



透水铺装和绿化



绿化



绿化



绿化



绿化



透水铺装和绿化



透水铺装和绿化



绿化



绿化

附件：

附件 1：《东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程水影响评价备案通知书》（通水评备[2023]第 75 号）；

附件 2：北京城市副中心管理委员会关于东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程项目建议书的批复（副中心发改（审）〔2022〕4 号）；

附件 3：水土保持措施实施量与批复情况对比分析；

附件 4：质量评定材料。

附图：

附图 1：地理位置图；

附图 2：水土保持设施竣工验收图。

附件 1:《建设项目水影响评价登记表备案通知书》(海水评备[2021]40 号)

北京市通州区水务局行政许可事项决定书

通水评备[2023]第 75 号

东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程水 影响评价备案通知书

北京市首发高速公路建设管理有限责任公司:

你单位申请备案的东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程水影响评价登记表收悉,准予备案。你单位应对登记表内容的合法性、真实性和准确性负责。请你单位持此通知书依法办理相关手续。

附件:建设项目水影响评价登记表(水务局留存登记表原件,登记表复印件加盖备案机关骑缝章后作为备案通知书附件)。

北京市通州区水务局
2023 年 09 月 18 日

抄送:区税务局。

北京市通州区水务局党政办公室

2023 年 09 月 18 日印发

附件 2：北京城市副中心管理委员会关于东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程项目建议书的批复（副中心发改（审）〔2022〕4 号）

北京城市副中心管理委员会文件

副中心发改（审）〔2022〕4 号

北京城市副中心管理委员会 关于东六环西侧路（张采路-土桥中街） 道路工程项目建议书的批复

北京市首发高速公路建设管理有限责任公司：

你单位《关于报送东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程项目建议书的请示》（京首建技字〔2022〕15 号）、《关于报审东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程项目招标方案核准的请示》（京首建技字〔2022〕14 号）收悉。为打通东六环西侧路断点，提升副中心南北向交通通达性，同意你单位实施东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程。现就有关事项批复如下：

一、建设规模及内容：项目南起张采路，北至土桥中街，全长约 1.6 公里，按城市主干路标准建设，红线宽度 55 米，同步实施交通、照明、绿化、雨水等工程。

二、投资规模及资金来源：工程总投资 5562 万元，全部由市政府固定资产投资安排解决。

三、请项目单位按照《关于进一步加强建筑废弃物资源化综合利用工作的意见》（京建法〔2018〕7 号）、《关于调整建筑废弃物再生产品种类及应用工程部位的通知》（京建发〔2019〕148 号）要求，在工程建设中选用建筑废弃物再生品。

四、本项目建设工期 4 个月。

五、本批复附《建设项目招标方案核准意见书》1 份。请项目单位据此依法开展招标工作。在建设项目实施过程中，确有特殊情况需要变更已核准的招标方案的，应报北京城市副中心管理委员会重新核准。

六、本批复有效期 1 年。请据此开展项目前期工作，编制项目可行性研究报告报北京市发展和改革委员会审批，并严格按照《关于印发加强市级政府性投资建设项目成本管控若干规定（试行）的通知》（京发改〔2019〕990 号）要求加强项目管理。

附件：建设项目招标方案核准意见书

北京城市副中心管理委员会
2022 年 11 月 10 日



（联系人：李书涛；联系电话：89555306）

附件

建设项目招标方案核准意见书

项目名称：东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程

项目建设单位名称：北京市首发高速公路建设管理有限责任公司

	采购细项	单项合同 估算金额 (万元)	招标方式 (公开招标或 邀请招标)	招标组织形式 (自行招标或 委托招标)	不采用 招标形式	备注
勘察	全部	50.03			核准	
设计	全部	166.78	公开招标	委托招标		
核准意见说明： 依据《北京市工程建设项目招标方案核准办法（试行）》，本工程勘察单项合同估算金额在100万元以下，同意核准为不招标。						

注意事项：

1、根据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号），依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在北京市公共资源交易服务平台、中国招标投标公共服务平台上发布。

2、政府投资项目，项目单位应当将资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息在北京市公共资源交易服务平台（ggzyfw.beijing.gov.cn）上全过程公开。

3、招标方案核准意见在本项目实施全过程有效。在项目实施过程中，如确有特殊情况需要变更已经核准的招标方案的，应当报北京城市副中心管理委员会重新核准。

抄送：市发展改革委、市规划自然资源委、市住房城乡建设委、市城市管理委、市交通委、市财政局、市生态环境局、市水务局、市园林绿化局、市公安局公安交通管理局，通州区政府。

北京城市副中心管理委员会

2022年11月10日印发



附件 3：水土保持措施实施量与批复情况对比分析

1、方案确定与实际发生的水土流失防治责任范围对比表

防治分区		防治责任范围		增减情况 (hm ²)
		方案确定 (hm ²)	实际发生 (hm ²)	
1	道路工程区	10.63	7.65	-2.98
2	施工生产生活区	(0.70)	(0.70)	0
合计		10.63	7.65	-2.98

经对比，项目实际发生的水土流失防治责任范围较水影响评价确定的水土流失防治责任减少 2.98hm²。主要原因为：本项目在实际施工过程中，两端部分实际由东六环路（京哈高速~苑北大街）改造工程项目实施。

综上，本项目实际发生的防治责任范围比方案确定的减少 2.98hm²。

2、方案设计与实际实施土石方挖填量对比

依据《东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程水影响评价登记表》，东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程建设挖填方总量为 2.19 万 m³，其中挖方总量 0.79 万 m³、填方总量 1.40 万 m³、借方 0.61 万 m³，借方来源为东六环路（京哈高速~潞苑北大街）改造工程，无余方。

通过与建设单位、施工单位、监理单位等核实，本项目实际土石方挖填总量 0.42 万 m³，其中挖方 0.04 万 m³，填方 0.38 万 m³，借方 0.34 万 m³，借方来源为东六环路（京哈高速~潞苑北大街）改造工程（此工程与本项目为同一建设单位及施工单位），无余方。

序号	分区	方案设计（万 m ³ ）				监测结果（万 m ³ ）				增减情况（万 m ³ ）			
		开挖	回填	借方	余方	开挖	回填	借方	余方	开挖	回填	借方	余方
1	道路工程区	0.79	1.40	0.61	0	0.04	0.38	0.34	0	-0.75	-1.02	-0.27	0
合计		0.79	1.40	0.61	0	0.04	0.38	0.34	0	-0.75	-1.02	-0.27	0

差异原因：因本项目在施工前，路基部分的土石方已由东六环路（京哈高速~潞苑北大街）改造工程实施完成，本项目仅作路面部分，同时本项目在实际施工过程中，两端部分实际由东六环路（京哈高速~苑北大街）改造工程项目实施。本项目实际发生的防治责任范围比方案确定的减少 2.98hm²。所以导致本项目土石方挖方、填方及借方量都减少。

3、方案设计与实际实施水土保持措施体系对比

防治分区		措施名称	单位	方案设计量	实际实施量	增减对比
工程措施	道路工程防治区	透水铺装	hm ²	1.22	0.81	-0.41
		整理绿化用地	hm ²	0.60	0.45	-0.15
植物措施	道路工程防治区	绿化隔离带	hm ²	0.60	0.45	-0.15
		边坡绿化	hm ²	2.67	2.67	0
临时措施	道路工程防治区	苫盖密目网	hm ²	10.63	11.50	+0.87
		洒水降尘	台时	200	520	+320
		临时排水沟	m	500	500	0
		临时沉沙池	座	2	2	0
	施工生产生活防治区	苫盖密目网	hm ²	0.70	0.70	0
		临时排水沟	m	500	500	0
		临时沉沙池	座	2	2	0

变化原因分析：

（1）因本项目在实际施工过程中，两端部分实际由东六环路（京哈高速~苑北大街）改造工程项目实施，道路工程防治区防治责任面积减少，导致透水铺装、整理绿化用地、绿化隔离带措施量都相应减少。

（2）因实际工期较设计工程有所增加，导致在施工期布设的苫盖密目网及洒水降尘措施量增加。

4、水土流失危害及综合效果防治分析

通过查阅本项目相关的水土保持资料，并问询参建单位及水土保持设施管护单位，同时对项目建设过程中遥感影像进行综合分析，结合项目现场实际情况，本项目在建设过程中水土保持措施运行良好，项目各参建单位注重项目水土保持工作，本项目建设过程中无水土流失危害情况发生，已实施的水土保持措施体系较为完善，防治效果显著，达到了水影响评价批复的各项指标，不存在导致水土保持情况降低的情势。

附件 4：质量评定材料

表C7-1

分项/分部工程施工报验表

工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程	资料编号	001																								
地点	位于通州区, 南起张采路, 北至十桥中街	日期	2025年3月6日																								
现我方已完成 西侧路中央隔离带及两侧慢行道 部位的 绿化种植 工程, 经我方检验符合设计、规范要求, 请予以验收。 附件: <table><thead><tr><th>名称</th><th>页数</th><th>编号</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 ☒ 质量控制资料汇总表(适用于分部工程)</td><td>1</td><td>页</td></tr><tr><td>2 ☒ 隐蔽工程检查记录表</td><td>12</td><td>页</td></tr><tr><td>3 ☒ 施工记录</td><td>4</td><td>页</td></tr><tr><td>4 ☐ 施工试验记录</td><td></td><td>页</td></tr><tr><td>5 ☒ 分项工程质量检验记录</td><td>8</td><td>页</td></tr><tr><td>6 ☒ 分部工程质量验收记录</td><td>1</td><td>页</td></tr><tr><td>7 ☐ 其他</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> 施工单位名称: 北京市首发天生态景观有限公司 质量员(签字): 马圣亮 技术负责人(签字): 王云 审查意见: 1、所报附件材料真实、齐全、有效。 2、所报检验批实体工程质量符合规范和设计要求。 审查结论: ☒ 合格 ☐ 不合格 监理单位名称: 北京正宏监理咨询有限公司 (总)监理工程师: 阮晓燕 审查日期: 2025年3月6日				名称	页数	编号	1 ☒ 质量控制资料汇总表(适用于分部工程)	1	页	2 ☒ 隐蔽工程检查记录表	12	页	3 ☒ 施工记录	4	页	4 ☐ 施工试验记录		页	5 ☒ 分项工程质量检验记录	8	页	6 ☒ 分部工程质量验收记录	1	页	7 ☐ 其他		
名称	页数	编号																									
1 ☒ 质量控制资料汇总表(适用于分部工程)	1	页																									
2 ☒ 隐蔽工程检查记录表	12	页																									
3 ☒ 施工记录	4	页																									
4 ☐ 施工试验记录		页																									
5 ☒ 分项工程质量检验记录	8	页																									
6 ☒ 分部工程质量验收记录	1	页																									
7 ☐ 其他																											

本表由施工单位填报, 监理、施工单位各存一份。如原属不合格的, 分项、分部工程报验应填写《不合格项处置记录》(表B2-9), 分部工程应由总监理工程师签字。

表C7-3

整理绿化用地 分项工程质量验收记录

单位工程名称	绿化种植		检验批数	5
施工单位	北京市首发天人生态景观有限公司		项目负责人	赵龙
分包单位	/		项目负责人	/
序号	检验批部位、单项、区段	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论	
1	西侧路中央隔离带（法桐）	合格	各分项工程检验批验收合格	
2	西侧路中央隔离带（法桐）	合格		
3	西侧路两侧慢行道（国槐）	合格		
4	西侧路两侧慢行道（乔灌木、地被）	合格		
5	西侧路中央隔离带（乔灌木、地被）	合格		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
检 查 结 论	整理绿化用地施工质量，符合质量验收规范要求，整理绿化用地分项工程合格。 项目专业技术负责人：王磊 2015年2月25日		验 收 结 论	同意验收 监理工程师：王磊 （建设单位项目专业技术负责人） 2015年2月25日

分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并记录。

表C7-3

种植穴 分项工程质量验收记录

单位工程名称	绿化种植		检验批数	5
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司		项目负责人	赵龙
分包单位	/		项目负责人	/
序号	检验批部位、单项、区段	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论	
1	西侧路中央隔离带（法桐）	合格	各分项工程检验批验收合格	
2	西侧路中央隔离带（法桐）	合格		
3	西侧路两侧慢行道（国槐）	合格		
4	西侧路两侧慢行道（乔灌木）	合格		
5	西侧路中央隔离带（乔灌木）	合格		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
检 查 结 论	种植穴施工质量，符合质量验收规范要求，种植穴分项工程合格。		验 收 结 论	同意验收 监理工程师：  （建设单位项目专业技术负责人） 2015年 2月 25日

分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并记录。

表C7-3

栽植 分项工程质量验收记录

单位工程名称	绿化种植		检验批数	5
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司		项目负责人	赵龙
分包单位	/		项目负责人	/
序号	检验批部位、单项、区段	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论	
1	西侧路中央隔离带（法桐）	合格	各分项工程检验批验收合格	
2	西侧路中央隔离带（法桐）	合格		
3	西侧路两侧慢行道（国槐）	合格		
4	西侧路两侧慢行道（乔灌木）	合格		
5	西侧路中央隔离带（乔灌木）	合格		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
检查结论	种植穴施工质量，符合质量验收规范要求，种植穴分项工程合格。 项目专业技术负责人：王平 2015年2月27日		验收结论	同意验收 监理工程师：王平 （建设单位项目专业技术负责人） 2015年2月27日

分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并记录。

表C7-3

分栽 分项工程质量验收记录

单位工程名称	绿化种植		检验批数	2
施工单位	北京市首发天人生态景观有限公司		项目负责人	赵龙
分包单位	/		项目负责人	/
序号	检验批部位、单项、区段	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论	
1	西侧路两侧慢行道（地被）	合格	各分项工程检验批验收合格	
2	西侧路中央隔离带（地被）	合格		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
检 查 结 论	种植穴施工质量，符合质量验收规范要求，种植穴分项工程合格。 项目专业技术负责人：王云 2025年1月27日		验 收 结 论	同意验收 监理工程师：王浩 （建设单位项目专业技术负责人） 2025年02月27日

分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并记录。

表07-3

围堰

分项工程质量验收记录

单位工程名称	绿化种植		检验批数	5
施工单位	北京市首发天人生态景观有限公司		项目负责人	赵龙
分包单位	/		项目负责人	/
序号	检验批部位、单项、区段	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论	
1	西侧路中央隔离带（法桐）	合格	各分项工程检验批验收合格	
2	西侧路中央隔离带（法桐）	合格		
3	西侧路两侧慢行道（国槐）	合格		
4	西侧路两侧慢行道（乔灌木、地被）	合格		
5	西侧路中央隔离带（乔灌木、地被）	合格		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
检查结论	种植穴施工质量，符合质量验收规范要求，种植穴分项工程合格。 项目专业技术负责人：王五 2025年2月7日		验收结论	同意验收 监理工程师：[签名] （建设单位项目专业技术负责人） 2025年2月7日

分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并记录。

表C7-3

支撑 分项工程质量验收记录

单位工程名称	绿化种植		检验批数	14
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司		项目负责人	赵龙
分包单位	/		项目负责人	/
序号	检验批部位、单项、区段	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论	
1	西侧路中央隔离带（法桐60株）	合格	各分项工程检验批验收合格	
2	西侧路中央隔离带（法桐60株）	合格		
3	西侧路中央隔离带（法桐30株）	合格		
4	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
5	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
6	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
7	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
8	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
9	西侧路中央隔离带（法桐55株）	合格		
10	西侧路中央隔离带（法桐55株）	合格		
11	西侧路两侧慢行道（国槐185株）	合格		
12	西侧路两侧慢行道（国槐185株）	合格		
13	西侧路两侧慢行道（国槐185株）	合格		
14	西侧路两侧慢行道（国槐185株）	合格		
15				
检查结论	种植穴施工质量，符合质量验收规范要求，种植穴分项工程合格。 项目专业技术负责人：王五 2015年2月27日		验收结论	同意验收 监理工程师：[签名] （建设单位项目专业技术负责人） 2015年2月27日

分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并记录。

表C7-3

浇灌水 分项工程质量验收记录

单位工程名称	绿化种植		检验批数	5
施工单位	北京市首发天人生态景观有限公司		项目负责人	赵龙
分包单位	/		项目负责人	/
序号	检验批部位、单项、区段	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论	
1	西侧路中央隔离带（法桐）	合格	各分项工程检验批验收合格	
2	西侧路中央隔离带（法桐）	合格		
3	西侧路两侧慢行道（国槐）	合格		
4	西侧路两侧慢行道（乔灌木、地被）	合格		
5	西侧路中央隔离带（乔灌木、地被）	合格		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
检 查 结 论	种植穴施工质量，符合质量验收规范要求，种植穴分项工程合格。 项目专业技术负责人：王立 2015年3月6日		验收 结 论 同意验收 监理工程师：（建设单位项目专业技术负责人） 2015年3月6日	

分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并记录。

表C7-3

修剪 分项工程质量验收记录

单位工程名称	绿化种植		检验批数	14
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司		项目负责人	赵龙
分包单位	/		项目负责人	/
序号	检验批部位、单项、区段	施工单位检查评定结果	监理（建设）单位验收结论	
1	西侧路中央隔离带（法桐60株）	合格	各分项工程检验批验收合格	
2	西侧路中央隔离带（法桐60株）	合格		
3	西侧路中央隔离带（法桐30株）	合格		
4	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
5	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
6	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
7	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
8	西侧路两侧慢行道（国槐210株）	合格		
9	西侧路中央隔离带（法桐55株）	合格		
10	西侧路中央隔离带（法桐55株）	合格		
11	西侧路两侧慢行道（国槐185株）	合格		
12	西侧路两侧慢行道（国槐185株）	合格		
13	西侧路两侧慢行道（国槐185株）	合格		
14	西侧路两侧慢行道（国槐185株）	合格		
15				
检查结论	种植穴施工质量，符合质量验收规范要求，种植穴分项工程合格。 项目专业技术负责人：王五 2015年2月27日		验收结论	同意验收 监理工程师：[签名] （建设单位项目专业技术负责人） 2015年2月27日

分项工程质量应由监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业技术负责人等进行验收并记录。

表C7-4

一般性基础 子分部工程质量验收记录

工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		部位	西侧路中央隔离带及两侧慢行道	
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司	技术负责人	王玉	质量负责人	马星亮
分包单位	/	分包项目负责人	/	施工班组长	张在晖
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	验收意见	
1	整理绿化用地	5	符合要求	同意验收	
2					
3					
4					
5					
质量控制资料		合格		验收合格	
安全、功能及涉及植物成活要素检验(检测)报告		合格		验收合格	
观感质量验收		好		验收合格	
验收单位	分包单位	项目负责人: / 年 月 日			
	施工单位	项目负责人: 赵龙 2015年2月25日			
	勘察单位	项目负责人: / 年 月 日			
	设计单位	项目负责人: 年 月 日			
	监理(建设)单位	总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 倪晓燕 2015年2月25日			

分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工单位项目负责人和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并填写记录表

表C7-4

一般性种植 子分部工程质量验收记录

工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		部位	西侧路中央隔离带及两侧慢行道	
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司	技术负责人	王玉	质量负责人	马星亮
分包单位	/	分包项目负责人	/	施工班组长	张在晖
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	验收意见	
1	种植穴	5	符合要求	同意验收	
2	栽植	5	符合要求		
3	分栽	2	符合要求		
4					
5					
质量控制资料		合格		验收合格	
安全、功能及涉及植物成活要素检验(检测)报告		合格		验收合格	
观感质量验收		好		验收合格	
验收单位	分包单位	项目负责人: / 年 月 日			
	施工单位	项目负责人: 赵龙 2015年2月27日			
	勘察单位	项目负责人: / 年 月 日			
	设计单位	项目负责人: 年 月 日			
	监理(建设)单位	总监理工程师: (建设单位项目专业负责人) 倪晓燕 2015年2月27日			

分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工单位项目负责人和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并填写记录表

表C7-4

苗木养护 子分部工程质量验收记录

工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		部位	西侧路中央隔离带及两侧慢行道	
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司	技术负责人	王玉	质量负责人	马星亮
分包单位	/	分包项目负责人	/	施工班组长	张在晖
序号	分项工程名称	检验批数	施工单位检查评定结果	验收意见	
1	围堰	5	符合要求	同意验收	
2	支撑	14	符合要求		
3	浇灌水	5	符合要求		
4	修剪	14	符合要求		
5					
质量控制资料		合格		验收合格	
安全、功能及涉及植物成活要素检验(检测)报告		合格		验收合格	
观感质量验收		好		验收合格	
验收单位	分包单位	项目负责人: / 年 月 日			
	施工单位	项目负责人: 2x6 2015年3月6日			
	勘察单位	项目负责人: / 年 月 日			
	设计单位	项目负责人: 年 月 日			
	监理(建设)单位	总监理工程师:(建设单位项目专业负责人) 倪晓燕 2015年3月6日			

分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工单位项目负责人和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并填写记录表

表C7-4

绿化种植 分部工程质量验收记录

工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		部位	西侧路中央隔离带及两侧慢行道	
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司	技术负责人	王玉	质量负责人	马星亮
分包单位	/	分包项目负责人	/	施工班组长	张在晖
序号	子分部工程名称	分项数	施工单位检查评定结果	验收意见	
1	一般性基础	1	符合要求	同意验收	
2	一般性种植	3	符合要求		
3	苗木养护	4	符合要求		
4			符合要求		
5					
质量控制资料		合格		验收合格	
安全、功能及涉及植物成活要素检验(检测)报告		合格		验收合格	
观感质量验收		好		验收合格	
验收单位	分包单位	项目负责人: / 年 月 日			
	施工单位	项目负责人: 2015年3月6日			
	勘察单位	项目负责人: / 年 月 日			
	设计单位	项目负责人: 年 月 日			
	监理(建设)单位	总监理工程师:(建设单位项目专业负责人) 2015年3月6日			

分部(子分部)工程质量应由总监理工程师(建设单位项目专业负责人)组织施工单位项目负责人和有关勘察、设计单位项目负责人进行验收,并填写记录表。

苗木、种子进场报验表 表C3-8			资料编号	01-04-C3-001	
工程名称	东六环西侧路(张采路~土桥中街)道路工程绿化工程				
现报上关于 绿化种植 工程的苗木/种子进场检验记录,该批物资经我方检验符合设计、规范及合同要求,请予以批准使用。					
序号	苗木/种子名称	来源(本地/外地)	单位	进场数量	检验日期
1	法桐	外地	株	60	2024年11月27日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
附件:					
名称		页数	编号		
1	☒ 苗木、种子进场检验记录	1 页	01-04-C3-001		
2	☐ 种子发芽率试验报告	_____ 页			
3	☒ 植物检疫证书(外阜苗木)	1 页	00751898		
4	☐ 产地检疫合格证(本地苗木)	_____ 页			
5	☒ 林木种子生产经营许可证	1 页			
6	☒ 其他附属文件	1 页			
施工单位名称: 北京市首发大生态景观有限公司			技术负责人:	王玉	
验收意见:					
苗木符合设计要求,可以入场使用。					
审定结论: ☐ 同意 ☒ 补报资料 ☐ 重新检验 ☐ 退场					
监理单位名称: 北京正宏监理咨询有限公司			监理工程师(签字):	验收日期: 2024年11月27日	

注: 本表由施工单位填写, 施工单位、监理单位各保存一份。

苗木进场检验记录 表C3-9								资料编号		01-04-C3-001							
工程名称		东六环西侧路(张采路~土桥中街)道路工程绿化工程															
施工单位		北京市首发天人生态景观有限公司															
供应单位		玉田县玉苗农民专业合作社						起苗日期		2024年11月26日							
								进场日期		2024年11月27日							
标准要求: 《城市园林绿化用植物材料木本苗》DB11/T 211-2003 《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T 212-2017																	
品种	检查内容																
	高度	胸径	土球	苗龄	冠径	分枝点	主枝数	主枝长	根系	竹鞭长	幼芽	携土厚	病虫害	损伤度	纯净度	蓬径	
法桐	>7m	10-12cm	120cm	/	>5m	2.8-3.0m	/	/	发达	/	/	/	无	无	/	/	
检查数量		60						检查方法			尺量、观察、植物检疫证						
检查结论:																	
☐ 合格																	
☐ 不合格																	
监理(建设)单位								施工单位									
								技术负责人					质量员				
																	

本表由施工单位填写并保存。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号	01-04-C3-001
工程名称	东六环西侧路(张采路~土桥中街)道路工程绿化工程		
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司		
合格证		代表数量	
苗木标签 冀()第 号 第三联 买主随货同行 树种(品种): 法桐 产地: 河南驻马店 数量: 60 直径: 10-12cm 苗高: >7m 主根长: 根幅: 大于5厘米 一级侧根数: 质量等级: 起苗日期: 2019.11.26 检疫编号: 00751898 生产证号: 13021920210012 经营许可证号: 13021920210012 联系电话: 13021920210012 经营单位(盖章) 法桐 60株			
粘贴人	赵永强	日期	2019年11月27日

本表由施工单位提供，建设单位、施工单位保存。



植物检疫证书(出省)



林草检字:冀 N⁰ 00751898


调运单位 (个人)	名称(姓名)	玉田县雨茁农民专业合作社					
	地 址	河北省玉田县大安镇徐家庄村					
	承 办 人	姓 名	姜雨茁	手机/座机	18822065139		
		身份证号码	132628*****1812				
收货单位 (个人)	名称(姓名)	北京市首发天人生态景观有限公司					
	地 址	北京市通州区六环路以西, 南起张采路, 北至土桥中街					
	联 系 人	姓 名	王涛	手机/座机	13269857039		
		身份证号码	110111*****8256				
植物或植物产品来源		河北省玉田县大安镇徐家庄村					
运 输 工 具		汽车					
运 输 起 迄		自 河北省唐山市玉田县 至 北京市市辖区通州区					
有 效 期 限		自 贰零贰肆年 拾壹月 贰拾柒日 至 贰零贰肆年 拾贰月 叁日					
植 物 名 称	品名(或材种)	规 格	单 位	数 量	包 装	备 注	
法桐	实生苗	胸径10-12cm	株	60	散装		
签发意见: 上述调运的植物或植物产品, 经(现场检疫), 未发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物, 以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。							
委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)							
检 疫 员(签名) 签证日期 2024 年 月 27 日							

第二联随货同行

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查;
2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和重复使用无效; 4. 一车(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地, 植物产品来源需注明加工地。

苗木、种子进场报验表 表C3-8			资料编号		01-04-C3-002
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程			
现报上关于 绿化种植 工程的苗木/种子进场检验记录,该批物资经我方检验符合设计、规范及合同要求,请予以批准使用。					
序号	苗木/种子名称	来源(本地/外地)	单位	进场数量	检验日期
1	国槐	外地	株	210	2024年12月23日
2	法桐	外地	株	30	2024年12月23日
					年 月 日
					年 月 日
					年 月 日
附件:					
名称		页数	编号		
1	☒ 苗木、种子进场检验记录	1	页	01-04-C3-002、 01-04-C3-003	
2	☐ 种子发芽率试验报告		页		
3	☒ 植物检疫证书(外阜苗木)	2	页	冀NO.00443776、 冀NO.00443777	
4	☐ 产地检疫合格证(本地苗木)		页		
5	☒ 林木种子生产经营许可证	1	页	13022920210010	
6	☒ 其他附属文件	1	页	营业执照复印件	
施工单位名称: 北京市首发天生态景观有限公司 技术负责人: 王云					
验收意见:					
审定结论: ☐ 同意 ☐ 补报资料 ☐ 重新检验 ☐ 退场					
监理单位名称: 北京正宏监理咨询有限公司		监理工程师(签字): 王云		验收日期: 2024年12月23日	

注: 本表由施工单位填写, 施工单位、监理单位各保存一份。

苗木进场检验记录 表C3-9										资料编号		01-04-C3-002					
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程															
施工单位		北京市首发天人生态景观有限公司															
供应单位		玉田县玉苗农民专业合作社								起苗日期		2024年12月22日					
										进场日期		2024年12月23日					
标准要求： 《城市园林绿化用植物材料木本苗》DB11/T 211-2003 《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T 212-2017																	
品种	检查内容																
	高度	胸径	土球	苗龄	冠径	分枝点	主枝数	主枝长	根系	竹鞭长	幼芽	携土厚	病虫害	损伤度	纯净度	蓬径	
国槐	>5m	10cm	100cm	/	>4m	≧2.8m	/	/	发达	/	/	/	无	无	/	/	
检查数量		210							检查方法		尺量、观察、植物检疫证						
检查结论： ☒ 合格 ☐ 不合格																	
监理（建设）单位								施工单位									
								技术负责人				质量员					
								王工				马圣亮					

本表由施工单位填写并保存。

苗木进场检验记录 表C3-9										资料编号		01-04-C3-003					
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程															
施工单位		北京市首发天生态景观有限公司															
供应单位		玉田县玉苗农民专业合作社								起苗日期		2024年12月22日					
										进场日期		2024年12月23日					
标准要求: 《城市园林绿化用植物材料木本苗》DB11/T 211-2003 《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T 212-2017																	
品种	检查内容																
	高度	胸径	土球	苗龄	冠径	分枝点	主枝数	主枝长	根系	竹鞭长	幼芽	携土厚	病虫害	损伤度	纯净度	蓬径	
法桐	>7m	10cm	100cm	/	>5m	2.8-3.0m	/	/	发达	/	/	/	无	无	/	/	
检查数量		30						检查方法		尺量、观察、植物检疫证							
检查结论: ☒ 合格 ☐ 不合格																	
监理(建设)单位						施工单位											
						技术负责人					质量员						
						王云					马星亮						

本表由施工单位填写并保存。



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀N^o 00443776

调运单位 (个人)	名称(姓名)	玉田县雨苗农民专业合作社					
	地 址	河北省玉田县大安镇徐家庄村					
	承 办 人	姓 名	姜雨苗	手机/座机	18822065139		
		身份证号码	132628*****1812				
收货单位 (个人)	名称(姓名)	北京市首发天生态景观有限公司					
	地 址	北京市通州区六环路以西, 南起张采路, 北至土桥中街					
	联 系 人	姓 名	王涛	手机/座机	13269857039		
		身份证号码	110111*****8256				
植物或植物产品来源		河北省玉田县大安镇徐家庄村					
运 输 工 具		汽车					
运 输 起 讫		自 河北省唐山市玉田县 至 北京市市辖区通州区					
有 效 期 限		自 贰零贰肆年 拾贰月 贰拾叁日 至 贰零贰肆年 拾贰月 贰拾玖日					
植 物 名 称	品名(或材种)	规格	单位	数量	包 装	备 注	
	国槐	实生苗	胸径10CM 株	90	散装		
	法桐	实生苗	胸径10CM 株	30	散装		
签发意见: 上述调运的植物或植物产品, 经 (现场检疫), 未 发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害 生物, 以及调入省(区、市)检疫性有害生物名录列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。 委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章) 检 疫 员 (签 名) 张 涛 签 证 日 期 2024 年 12 月 23 日							

第
二
联
随
货
同
行

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查;
2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和
重复使用无效; 4. 一年(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植
物来源需注明生产地, 植物产品来源需注明加工地。



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀N^o 00443777

调运单位 (个人)	名称(姓名)	玉田县雨茁农民专业合作社					
	地 址	河北省玉田县大安镇徐家庄村					
	承 办 人	姓 名	姜雨茁	手机/座机	18822065139		
		身份证号码	132628*****1812				
收货单位 (个人)	名称(姓名)	北京市首发天人生态景观有限公司					
	地 址	北京市通州区六环路以西, 南起张采路, 北至土桥中街					
	联 系 人	姓 名	王涛	手机/座机	13269857039		
		身份证号码	110111*****8256				
植物或植物产品来源		河北省玉田县大安镇徐家庄村					
运 输 工 具		汽车					
运 输 起 迄		自 河北省唐山市玉田县 至 北京市市辖区通州区					
有 效 期 限		自 贰零贰肆年 拾贰月 贰拾叁日 至 贰零贰肆年 拾贰月 贰拾玖日					
植 物 名 称	品名(或材种)	规格	单位	数量	包装	备注	
	国槐	实生苗	胸径10CM 株	120	散装		
签发意见: 上列调运的植物或植物产品, 经 (现场检疫), 未 发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害 生物, 以及调入省(区、市)检疫性有害生物列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。 委托机关(省级植物检疫机构和植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章) 检 疫 员 (签 名) 签 证 日 期 2024 年 12 月 23 日							

第
二
联
随
货
同
行

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查;
2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和
重复使用无效; 4. 一车(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植
物来源需注明生产地, 植物产品来源需注明加工地。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号	01-04-C3-002
工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		
施工单位	北京市首发天人生态景观有限公司		
合格证		代表数量	
苗木标签 第三联 买主随货同行 冀()第 号 树种(品种): 国槐 产地: 河北 苗高: >5m 直径: 10cm 根幅: 大于5厘米 数量: 210株 主根长: 侧根数: 一级侧根数: 质量等级: 一级 起苗日期: 2024.12.24 检疫编号: 冀N0.004437716 生产证号: 1502290010010 经营单位(盖章): 河北农业合作社 联系电话: 9313029		国槐 210株	
粘贴人	孙宁菲	日期	2024年12月23日

本表由施工单位提供，建设单位、施工单位保存。

苗木、种子进场报验表 表C3-8			资料编号	01-04-C3-003	
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程			
现报上关于 绿化种植 工程的苗木/种子进场检验记录, 该批物资经我方检验符合设计、规范及合同要求, 请予以批准使用。					
序号	苗木/种子名称	来源(本地/外地)	单位	进场数量	检验日期
1	国槐	外地	株	185	2025年02月27日
2	法桐	外地	株	55	2025年02月27日
3	金叶女贞球	外地	株	112	2025年02月27日
4	大叶黄杨	外地	株	40600	2025年02月27日
5	金叶女贞	外地	株	21825	2025年02月27日
附件:					
1	☒ 苗木、种子进场检验记录	1 页	01-04-C3-004		
2	☐ 种子发芽率试验报告	页			
3	☒ 植物检疫证书(外阜苗木)	2 页	冀NO. 00743692、00743693		
4	☐ 产地检疫合格证(本地苗木)	页			
5	☒ 林木种子生产经营许可证	1 页			
6	☒ 其他附属文件	1 页	营业执照复印件		
施工单位名称: 北京市首发天生态景观有限公司 技术负责人: 王云					
验收意见:					
审定结论: ☒ 同意 ☐ 补报资料 ☐ 重新检验 ☐ 退场					
监理单位名称: 北京正宏监理咨询有限公司 监理工程师(签字): 验收日期: 2025年02月27日					

注: 本表由施工单位填写, 施工单位、监理单位各保存一份。

苗木、种子进场报验表 表C3-8			资料编号	01-04-C3-004	
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程			
现报上关于 绿化种植 工程的苗木/种子进场检验记录, 该批物资经我方检验符合设计、规范及合同要求, 请予以批准使用。					
序号	苗木/种子名称	来源(本地/外地)	单位	进场数量	检验日期
1	马蔺	外地	株	15125	2015年2月27日
2	宿根天人菊	外地	株	1650	2015年2月27日
3	麦冬	外地	株	21511	2015年2月27日
附件:					
	名称	页数	编号		
1	☒ 苗木、种子进场检验记录	1	页	01-04-C3-004	
2	☐ 种子发芽率试验报告		页		
3	☒ 植物检疫证书(外阜苗木)	1	页	冀NO. 00743693	
4	☐ 产地检疫合格证(本地苗木)		页		
5	☒ 林木种子生产经营许可证	1	页		
6	☒ 其他附属文件	1	页	营业执照复印件	
施工单位名称: 北京市首发天生态景观有限公司 技术负责人: 王五					
验收意见:					
审定结论: ☒ 同意 ☐ 补报资料 ☐ 重新检验 ☐ 退场					
监理单位名称: 北京正宏监理咨询有限公司 监理工程师(签字): 验收日期: 2015年2月27日					

注: 本表由施工单位填写, 施工单位、监理单位各保存一份。

苗木进场检验记录 表C3-9										资料编号		01-04-C3-004					
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程															
施工单位		北京市首发天人生态景观有限公司															
供应单位		玉田县玉茁农民专业合作社								起苗日期		2025年02月27日					
										进场日期		2025年02月27日					
标准要求: 《城市园林绿化用植物材料木本苗》DB11/T 211-2003 《园林绿化工程施工及验收规范》DB11/T 212-2017																	
品种	检查内容																
	高度	胸径	土球	苗龄	冠径	分枝点	主枝数	主枝长	根系	竹鞭长	幼芽	携土厚	病虫害	损伤度	纯净度	蓬径	
国槐	>5m	10cm	100cm	/	>4m	≥2.8m	/	/	发达	/	/	/	无	无	/	/	
法桐	>7m	10cm	100cm	/	>5m	2.8-3.0m	/	/	发达	/	/	/	无	无	/	/	
金叶女贞球	60cm	/	20cm	/	60-80cm	/	/	/	发达	/	/	/	无	无	/	/	
大叶黄杨	50cm	/	15cm	/	≥25	/	/	/	发达	/	/	/	无	无	/	/	
金叶女贞	50cm	/	15cm	/	≥25	/	/	/	发达	/	/	/	无	无	/	/	
马蔺	30-40cm	/	10cm	/	≥20	/	/	/	发达	/	3-5芽	/	无	无	/	/	
宿根天人菊	40-60cm	/	15cm	/	≥20	/	/	/	发达	/	3-5芽	/	无	无	/	/	
麦冬	≥30cm	/	/	/	≥20	/	/	/	发达	/	/	/	无	无	/	/	
检查数量		全数检查							检查方法		尺量、观察、植物检疫证						
检查结论: ☒ 合格 ☐ 不合格																	
监理(建设)单位								施工单位									
								技术负责人				质量员					
																	

本表由施工单位填写并保存。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号	01-04-C3-004
工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		
施工单位	北京市首发天人生态景观有限公司		
合格证		代表数量	
		国槐 185株	
粘贴人	赵宇菲	日期	2013年2月27日

本表由施工单位提供, 建设单位、施工单位保存。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号 01-04-C3-005
工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程	
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司	
合格证		代表数量
苗木标签 树种 <u>法桐</u> 品种 _____ 苗木种类 _____ 苗龄 _____ 种子产地 _____ 质量等级 _____ 数量 <u>55株</u> 生产日期(起苗) <u>2015</u> 年 <u>2</u> 月 苗批号 _____ 林木种子生产经营许可证编号 <u>X13022920120010</u> 产地检疫编号 <u>冀140.007168192</u> 生产经营者 <u>玉田县宇泰农业种植专业合作社</u> 注册地址 <u>河北省玉田县康家营镇王庄</u> 生产经营者电话 _____ 备注 _____		法桐 55株
粘贴人	<u>赵学东</u>	日期 2015年2月17日

本表由施工单位提供,建设单位、施工单位保存。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号	01-04-C3-006
工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司		
合格证		代表数量	
苗木标签 树种 <u>金叶女贞</u> 品种 _____ 苗木种类 _____ 苗龄 _____ 种子产地 _____ 质量等级 _____ 数量 <u>112株</u> 生产日期(起苗) <u>2015</u> 年 <u>2</u> 月 苗批号 _____ 林木种子生产经营许可证编号 <u>X13022920220010</u> 产地检疫编号 <u>冀北00793692</u> 生产经营者 <u>玉田县森林农业科技发展有限公司</u> 注册地址 <u>河北省唐山市玉田县郭家屯镇北大街</u> 生产经营者电话 _____ 备注 _____		金叶女贞 112株	
粘贴人	<u>赵子菲</u>	日期	<u>2015年2月17日</u>

本表由施工单位提供, 建设单位、施工单位保存。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号	01-04-C3-007
工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司		
合格证		代表数量	
苗木标签 树种 <u>大叶黄杨</u> 品种 _____ 苗木种类 _____ 苗龄 _____ 种子产地 _____ 质量等级 _____ 数量 <u>40600株</u> 生产日期(起苗) <u>2015</u> 年 <u>2</u> 月 苗批号 _____ 林木种子生产经营许可证编号 <u>X13022920220010</u> 产地检疫编号 <u>豫A 02742183</u> 生产经营者 <u>玉田县丰泰林业种植有限公司</u> 注册地址 <u>河北省唐山市玉田县郭家屯镇北王庄</u> 生产经营者电话 _____ 备注 _____		大叶黄杨 40600株	
粘贴人	<u>赵宇菲</u>	日期	<u>2015</u> 年 <u>2</u> 月 <u>17</u> 日

本表由施工单位提供, 建设单位、施工单位保存。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号	01-04-C3-008
工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司		
合格证		代表数量	
苗木标签 树种 <u>金叶女贞</u> 品种 _____ 苗木种类 _____ 苗龄 _____ 种子产地 _____ 质量等级 _____ 数量 <u>21825株</u> 生产日期(起苗) <u>2015</u> 年 <u>2</u> 月 苗批号 _____ 林木种子生产经营许可证编号 <u>X13022720220010</u> 产地检疫编号 <u>冀1200743192</u> 生产经营者 <u>玉田县农业科技有限公司</u> 注册地址 <u>河北省唐山市玉田县农业科技园</u> 生产经营者电话 _____ 备注 _____		金叶女贞 21825株	
粘贴人	<u>李学东</u>	日期	<u>2015</u> 年 <u>2</u> 月 <u>27</u> 日

本表由施工单位提供，建设单位、施工单位保存。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号	01-04-C3-009
工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		
施工单位	北京市首发天生态景观有限公司		
合格证		代表数量	
苗木标签 树种 <u>马蔺</u> 品种 _____ 苗木种类 _____ 苗龄 _____ 种子产地 _____ 质量等级 _____ 数量 <u>15125株</u> 生产日期(起苗) <u>2025</u> 年 <u>2</u> 月 苗批号 _____ 林木种子生产经营许可证编号 _____ <u>X13022920110010</u> 产地检疫编号 <u>京1400742678</u> 生产经营者 <u>玉田县鑫泰苗木有限公司</u> 注册地址 <u>河北省唐山市玉田县郭家铺镇北庄子</u> 生产经营者电话 _____ 备注 _____		马蔺 15125株	
粘贴人	<u>张辛菲</u>	日期	<u>2025年2月27日</u>

本表由施工单位提供，建设单位、施工单位保存。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号	01-04-C3-010
工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		
施工单位	北京市首发天人生态景观有限公司		
合格证		代表数量	
苗木标签 树种 <u>宿根天人菊</u> 品种 _____ 苗木种类 _____ 苗龄 _____ 种子产地 _____ 质量等级 _____ 数量 <u>1650株</u> 生产日期(起苗) <u>2015</u> 年 <u>2</u> 月 苗批号 _____ 林木种子生产经营许可证编号 _____ <u>X13022920220010</u> 产地检疫编号 <u>京A.00743693</u> 生产经营者 <u>玉田县景泰农林科技有限公司</u> 注册地址 <u>河北省唐山市玉田县唐安镇北王庄</u> 生产经营者电话 _____ 备注 _____		宿根天人菊 1650株	
粘贴人	<u>赵子菲</u>	日期	<u>2015</u> 年 <u>2</u> 月 <u>27</u> 日

本表由施工单位提供,建设单位、施工单位保存。

产品合格证粘贴衬纸 表C3-7		资料编号	01-04-C3-011
工程名称	东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程绿化工程		
施工单位	北京市首发天人生态景观有限公司		
合格证		代表数量	
苗木标签 树种 <u>麦冬</u> 品种 _____ 苗木种类 _____ 苗龄 _____ 种子产地 _____ 质量等级 _____ 数量 <u>21511</u> 株 生产日期(起苗) <u>2015</u> 年 <u>1</u> 月 苗批号 _____ 林木种子生产经营许可证编号 <u>X13022920120010</u> 产地检疫编号 <u>冀Na 00743673</u> 生产经营者 <u>玉田县首发农业种植有限公司</u> 注册地址 <u>河北省玉田县前庄子村</u> 生产经营者电话 _____ 备注 _____		麦冬 21511株	
粘贴人	<u>赵孝菲</u>	日期	2015 年 2 月 27 日

本表由施工单位提供，建设单位、施工单位保存。



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀 N^o 00743692

调运单位 (个人)	名称(姓名)	玉田县宇森农业种植有限公司					
	地 址	河北省玉田县郭家屯镇北王庄村					
	承 办 人	姓 名	宋立光	手机/座机	13920064546		
		身份证号码	120225*****1895				
收货单位 (个人)	名称(姓名)	北京市首发天人生态景观有限公司					
	地 址	北京市通州区通州路六环路以西,南起张彩路,北至土桥中街(东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路)					
	联 系 人	姓 名	王强	手机/座机	13269857039		
		身份证号码	110111*****8256				
植物或植物产品来源		河北省玉田县郭家屯镇北王庄村					
运 输 工 具		汽车					
运 输 起 迄		自 河北省唐山市玉田县 至 北京市市辖区通州区					
有 效 期 限		自 贰零贰伍年 贰月 贰拾柒日 至 贰零贰伍年 叁月 伍日					
植 物 名 称	品名(或材种)	规格	单位	数量	包装	备注	
	金叶女贞球	实生苗	HQ.6m	株	112	散装	
	国槐	实生苗	胸径9-10cm	株	187	散装	
	法桐	实生苗	胸径10-12cm	株	55	散装	
签发意见: 上列调运的植物或植物产品, 经 (现场检疫), 未发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物, 以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。							
委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)							
检疫专用章							
检疫员(签名) 签证日期 年 02 月 27 日							

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查;
2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和重复使用无效; 4. 一车(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地, 植物产品来源需注明加工地。



植物检疫证书 (出省)



林草检字:冀 N° 00743693

调运单位 (个人)	名称(姓名)	玉田县宇森农业种植有限公司					
	地 址	河北省玉田县郭家屯镇北王庄村					
	承 办 人	姓 名	宋立光	手机/座机	13920064546		
		身份证号码	120225*****1895				
收货单位 (个人)	名称(姓名)	北京市首发天人生态景观有限公司					
	地 址	北京市通州区通州路六环路以西, 南起张彩路, 北至土桥中街 (东六环西侧路(张采路、土桥中街)道路南侧(自西向东))					
	联 系 人	姓 名	王海	手机/座机	13269857039		
		身份证号码	110111*****8256				
植物或植物产品来源		河北省玉田县郭家屯镇北王庄村					
运 输 工 具		汽车					
运 输 起 迄		自河北省唐山市玉田县 至 北京市市辖区通州区					
有 效 期 限		自 贰零贰伍 年 贰 月 贰拾柒 日至 贰零贰伍 年 叁 月 伍 日					
植 物 名 称	品名(或材种)	规格	单位	数量	包装	备注	
麦冬	实生苗	H>0.3m	株	21511	散装		
宿根天人菊	实生苗	H0.4-0.5m	株	1650	散装		
马蔺	实生苗	H0.3-0.4m	株	15125	散装		
金叶女贞	实生苗	H0.5m	株	21825	散装		
大叶黄杨	实生苗	H0.5m	株	40600	散装		
签发意见: 上列调运的植物或植物产品, 经 (现场检疫), 未发现全国检疫性林业有害生物, 本省(区、市)和调入省(区、市)补充检疫性林业有害生物, 以及调入省(区、市)检疫要求书列出的其他危险性林业有害生物, 同意调运。							
委托机关(省级植物检疫机构植物检疫专用章) 签发机关(植物检疫专用章)							
检 疫 员(签名) 签证日期 000 年 00 月 00 日							

第二联 随货同行

注: 1. 本证一式两联, 第一联存签证机关, 第二联随货同行, 由收货单位(人)保存2年备查; 2. 本证无调出地植物检疫机构植物检疫专用章和植物检疫员签名无效; 3. 本证转让、涂改和重复使用无效; 4. 一车(船)一证, 货证相符, 全程有效; 5. “植物或植物产品来源”中植物来源需注明生产地, 植物产品来源需注明加工地。

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)										编号		05030201 001			
工程名称		东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程													
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)		分项工程		透水面层		桩号(部位)		FYK0+523.925-FYK0+700					
施工单位		北京城建集团有限责任公司		项目经理		张晓伟		项目技术负责人		仇伟					
专业分包单位		/		专业分包项目经理		/		分包项目技术负责人		/					
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012													
质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录						监理(建设)单位验收记录			
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求		第7.2.1条第1款		合格证、出厂检验报告齐全有效；进场复试合格						合格			
	2	结构层的透水性要求		第7.2.1条第2款		符合规范规定要求									
	3	透水砖的铺筑形式		第7.2.1条第3款		符合规范规定要求									
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定		第7.2.1条第4款		符合规范规定要求									
一般项目	1	透水砖铺砌质量		第7.2.2条第1款		平整、稳固，无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷，无翘动现象，灌缝饱满，缝隙一致						合格			
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量		第7.2.2条第2款		接顺，无反坡积水现象									
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	2	4	1	0	3	0	4				
			宽度(mm)	不小于设计规定	756	755	730	725	755	745	745				
			相邻块高差(mm)	≤2	1	0	0	1	0	1	0				
			横坡(%)	±0.3	-0.1	0	-0.2	0.2	-0.3	-0.2	0.1				
			道路中线偏位(mm)	≤20	14	17	18	13	18	1	15				
			纵缝直顺度(mm)	≤10	6	7	9	7	3	1	5				
			横缝直顺度(mm)	≤10	7	7	1	9	1	10	9				
			缝宽(mm)	±2	-2	-2	-1	-1	1	-1	2				
			井框与路面高差(mm)	≤3	1	1	1	0	2	2	0				
			高程(mm)	±20	-4	19	17	-7	13	9	-15				
			各结构层厚度(mm)	±10	9	2	-2	6	-7	5	4				
施工单位检查结果		主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求													
		专业工长: 葛洪峰 项目专业质量检查员: 安飞 2024年10月27日													
监理(建设)单位验收结论		验收合格													
		专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 韩杨 2024年10月27日													

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)										编号		05030201 002				
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程														
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)		分项工程		透水面层		桩号(部位)		FYK0+700--FYK0+800						
施工单位		北京城建集团有限责任公司		项目经理		张晓伟		项目技术负责人		仇伟						
专业分包单位		/		专业分包项目经理		/		分包项目技术负责人		/						
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012														
质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录						监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	透水砖的透水性等要求		第7.2.1条第1款		合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格						合格				
	2	结构层的透水性要求		第7.2.1条第2款		符合规范规定要求										
	3	透水砖的铺筑形式		第7.2.1条第3款		符合规范规定要求										
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定		第7.2.1条第4款		符合规范规定要求										
一般项目	1	透水砖铺砌质量		第7.2.2条第1款		平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致						合格				
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量		第7.2.2条第2款		接顺,无反坡积水现象										
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	4	0	2	4	3	4	2					
			宽度(mm)	不小于设计规定	725	755	745	745	756	755	730					
			相邻块高差(mm)	≤2	1	2	1	1	0	1	1					
			横坡(%)	±0.3	0	-0.2	0.1	-0.2	-0.2	0.2	0.1					
			道路中线偏位(mm)	≤20	3	4	14	16	20	1	3					
			纵缝直顺度(mm)	≤10	3	6	4	5	2	8	8					
			横缝直顺度(mm)	≤10	1	2	9	6	8	6	3					
			缝宽(mm)	±2	0	1	2	-1	-1	-1	0					
			井框与路面高差(mm)	≤3	0	2	0	1	0	0	1					
			高程(mm)	±20	0	10	1	2	17	7	-8					
	各结构层厚度(mm)	±10	-4	10	-2	6	-8	-1	4							
	施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求													
		专业工长: 葛兴峰 项目专业质量检查员: 王鑫 2024年10月29日														
监理(建设)单位验收结论		验收合格														
		专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 韩杨 2024年10月29日														

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)										编号		05030201 003				
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程														
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)		分项工程		透水面层		桩号(部位)		FYK0+800—FYK0+900						
施工单位		北京城建集团有限责任公司		项目经理		张晓伟		项目技术负责人		仇伟						
专业分包单位		/		专业分包项目经理		/		分包项目技术负责人		/						
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012														
质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录						监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求		第7.2.1条第1款		合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格						合格				
	2	结构层的透水性要求		第7.2.1条第2款		符合规范规定要求										
	3	透水砖的铺筑形式		第7.2.1条第3款		符合规范规定要求										
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定		第7.2.1条第4款		符合规范规定要求										
一般项目	1	透水砖铺砌质量		第7.2.2条第1款		平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致						合格				
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量		第7.2.2条第2款		接顺,无反坡积水现象										
	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5		0	2	1	2	0	5	1					
		宽度(mm)	不小于设计规定		755	755	730	755	755	745	725					
		相邻块高差(mm)	≤2		1	2	1	0	0	0	1					
		横坡(%)	±0.3		0.2	0.1	0.3	0.1	-0.3	0.3	0					
		道路中线偏位(mm)	≤20		18	4	15	18	5	7	9					
		纵缝直顺度(mm)	≤10		8	3	1	5	4	8	10					
		横缝直顺度(mm)	≤10		2	5	1	4	5	3	3					
		缝宽(mm)	±2		2	-1	2	-2	1	-1	-1					
		井框与路面高差(mm)	≤3		2	1	3	2	3	1	0					
		高程(mm)	±20		-14	-9	9	8	12	-18	-4					
	各结构层厚度(mm)	±10		-1	6	4	2	2	8	7						
	施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 专业工长 葛洪峰 项目专业质量检查员 张彦 2024年11月02日													
监理(建设)单位验收结论		验收合格 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 韩杨 2024年11月02日														

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)					编号	05030201 004									
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程													
分部(子分部)工程	人行道(路面砖面层)	分项工程	透水面层	桩号(部位)	FYK0+900--FYK1+000										
施工单位	北京城建集团有限责任公司	项目经理	张晓伟	项目技术负责人	仇伟										
专业分包单位	/	专业分包项目经理	/	分包项目技术负责人	/										
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012													
质量验收规范的规定			施工单位检查评定记录		监理(建设)单位验收记录										
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求	第7.2.1条第1款	合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格		合格									
	2	结构层的透水性要求	第7.2.1条第2款	符合规范规定要求											
	3	透水砖的铺筑形式	第7.2.1条第3款	符合规范规定要求											
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定	第7.2.1条第4款	符合规范规定要求											
一般项目	1	透水砖铺砌质量	第7.2.2条第1款	平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致		合格									
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量	第7.2.2条第2款	接顺,无反坡积水现象											
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	5		1	4	4	1	2	5			
			宽度(mm)	不小于设计规定	756		745	730	725	750	745	750			
			相邻块高差(mm)	≤2	1		1	0	1	0	1	2			
			横坡(%)	±0.3	0.1		0.3	0.1	0.2	-0.2	0.2	-0.1			
			道路中线偏位(mm)	≤20	3		16	7	12	10	7	8			
			纵缝直顺度(mm)	≤10	1		6	0	1	9	10	3			
			横缝直顺度(mm)	≤10	7		9	3	0	5	7	4			
			缝宽(mm)	±2	-1		-1	1	-2	2	-2	1			
			井框与路面高差(mm)	≤3	1		2	3	2	3	2	3			
			高程(mm)	±20	-16		17	2	15	-11	15	-18			
			各结构层厚度(mm)	±10	-8		1	2	8	-9	-3	7			
			施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求										
专业工长:葛梁峰		项目专业质量检查员:李庆		2024年11月04日											
监理(建设)单位验收结论		验收合格													
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):李杨		2024年11月04日													

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)										编号		05030201 005				
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程														
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)		分项工程		透水面层		桩号(部位)		FYK1+000--FYK1+100						
施工单位		北京城建集团有限责任公司		项目经理		张晓伟		项目技术负责人		仇伟						
专业分包单位		/		专业分包项目经理		/		分包项目技术负责人		/						
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012														
质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录						监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求		第7.2.1条第1款		合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格						合格				
	2	结构层的透水性要求		第7.2.1条第2款		符合规范规定要求										
	3	透水砖的铺筑形式		第7.2.1条第3款		符合规范规定要求										
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定		第7.2.1条第4款		符合规范规定要求										
一般项目	1	透水砖铺砌质量		第7.2.2条第1款		平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致						合格				
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量		第7.2.2条第2款		接顺,无反坡积水现象										
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	2	1	5	0	4	1	2					
			宽度(mm)	不小于设计规定	56	755	730	725	755	745	745					
			相邻块高差(mm)	≤2	0	1	1	2	0	1	1					
			横坡(%)	±0.3	0	0.2	0.1	-0.3	0.1	0.1	-0.1					
			道路中线偏位(mm)	≤20	15	14	1	4	17	20	6					
			纵缝直顺度(mm)	≤10	2	8	1	10	9	10	10					
			横缝直顺度(mm)	≤10	8	8	6	5	9	4	2					
			缝宽(mm)	±2	2	-1	0	-1	-2	1	1					
			井框与路面高差(mm)	≤3	2	2	2	0	2	3	3					
			高程(mm)	±20	-1	-6	10	-13	9	3	-16					
		各结构层厚度(mm)	±10	2	9	5	-8	-1	6	5						
	施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求													
		专业工长: 葛梁峰 项目专业质量检查员: 安晓 2024年11月05日														
监理(建设)单位验收结论		验收合格														
		专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 韩杨 2024年11月05日														

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)					编号	05030201 006									
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程													
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)		分项工程		透水面层		桩号(部位)		FYK1+100- -FYK1+174.702					
施工单位		北京城建集团有限责任公司		项目经理		张晓伟		项目技术负责人		仇伟					
专业分包单位		/		专业分包项目经理		/		分包项目技术负责人		/					
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012													
质量验收规范的规定					施工单位检查评定记录					监理(建设)单位验收记录					
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求		第7.2.1条第1款		合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格					合格				
	2	结构层的透水性要求		第7.2.1条第2款		符合规范规定要求									
	3	透水砖的铺筑形式		第7.2.1条第3款		符合规范规定要求									
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定		第7.2.1条第4款		符合规范规定要求									
一般项目	1	透水砖铺砌质量		第7.2.2条第1款		平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致					合格				
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量		第7.2.2条第2款		接顺,无反坡积水现象									
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	3	1	3	2	2	2		3			
			宽度(mm)	不小于设计规定	751	755	748	725	755	745		745			
			相邻块高差(mm)	≤2	1	1	2	2	2	2		2			
			横坡(%)	±0.3	0.3	0	-0.3	0.1	0.3	-0.1		-0.2			
			道路中线偏位(mm)	≤20	11	15	9	12	17	14		2			
			纵缝直顺度(mm)	≤10	5	9	7	7	5	4		8			
			横缝直顺度(mm)	≤10	1	2	5	4	5	5		10			
			缝宽(mm)	±2	-2	0	-2	-1	1	2		2			
			井框与路面高差(mm)	≤3	3	1	2	1	2	2		1			
			高程(mm)	±20	15	4	-6	1	13	-11		-7			
		各结构层厚度(mm)	±10	9	-9	-4	5	4	-5	-6					
施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 专业工长:葛洪峰 项目专业质量检查员:李彦以 2024年11月07日													
监理(建设)单位验收结论		验收合格 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):韩杨 2024年11月07日													

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)					编号	05030201 007									
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程													
分部(子分部)工程	人行道(路面砖面层)	分项工程	透水面层	桩号(部位)	FZK0+479.383-FZK0+620										
施工单位	北京城建集团有限责任公司	项目经理	张晓伟	项目技术负责人	仇伟										
专业分包单位	/	专业分包项目经理	/	分包项目技术负责人	/										
执行标准名称及编号	《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012														
质量验收规范的规定			施工单位检查评定记录		监理(建设)单位验收记录										
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求	第7.2.1条第1款	合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格		合格									
	2	结构层的透水性要求	第7.2.1条第2款	符合规范规定要求											
	3	透水砖的铺筑形式	第7.2.1条第3款	符合规范规定要求											
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定	第7.2.1条第4款	符合规范规定要求											
一般项目	1	透水砖铺砌质量	第7.2.2条第1款	平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致		合格									
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量	第7.2.2条第2款	接顺,无反坡积水现象											
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	3		0	0	2	1	1	4			
			宽度(mm)	不小于设计规定	755		755	730	755	755	745	745			
			相邻块高差(mm)	≤2	2		0	1	1	1	2	1			
			横坡(%)	±0.3	-0.2		0.2	0.2	0.2	0.1	-0.2	0.1			
			道路中线偏位(mm)	≤20	17		12	3	2	6	0	17			
			纵缝直顺度(mm)	≤10	7		8	6	3	2	8	3			
			横缝直顺度(mm)	≤10	7		3	7	6	7	9	5			
			缝宽(mm)	±2	-1		-2	0	1	-2	0	1			
			井框与路面高差(mm)	≤3	2		1	1	1	3	1	1			
			高程(mm)	±20	19		7	16	17	-5	15	-1			
			各结构层厚度(mm)	±10	-6		0	-5	6	-9	1	-1			
			施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求										
专业工长: 葛荣峰		项目专业质量检查员: 张庆飞		2024年10月23日											
监理(建设)单位验收结论		验收合格													
专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 韩本功		2024年10月23日													

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)										编号		05030201 008				
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程														
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)		分项工程		透水面层		桩号(部位)		FZK0+620--FZK0+700						
施工单位		北京城建集团有限责任公司		项目经理		张晓伟		项目技术负责人		仇伟						
专业分包单位		/		专业分包项目经理		/		分包项目技术负责人		/						
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012														
质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录						监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求		第7.2.1条第1款		合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格						合格				
	2	结构层的透水性要求		第7.2.1条第2款		符合规范规定要求										
	3	透水砖的铺筑形式		第7.2.1条第3款		符合规范规定要求										
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定		第7.2.1条第4款		符合规范规定要求										
一般项目	1	透水砖铺砌质量		第7.2.2条第1款		平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致						合格				
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量		第7.2.2条第2款		接顺,无反坡积水现象										
	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5		1	5	2	4	3	1	2					
		宽度(mm)	不小于设计规定		751	755	735	725	755	750	745					
		相邻块高差(mm)	≤2		0	2	1	1	2	2	2					
		横坡(%)	±0.3		-0.2	0.2	0.1	0	0.1	-0.2	0.1					
		道路中线偏位(mm)	≤20		14	11	1	18	3	13	20					
		纵缝直顺度(mm)	≤10		6	1	0	7	2	8	0					
		横缝直顺度(mm)	≤10		6	8	4	2	1	8	9					
		缝宽(mm)	±2		1	2	-1	0	2	-1	-1					
		井框与路面高差(mm)	≤3		3	2	2	1	1	0	0					
		高程(mm)	±20		8	-1	-4	11	14	0	-3					
	各结构层厚度(mm)	±10		6	-3	-6	7	10	-10	2						
	施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求													
		专业工长: 薛其峰 项目专业质量检查员: 宋启 2024年10月25日														
监理(建设)单位验收结论		验收合格														
		专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 郭伟 2024年10月25日														

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)										编号		05030201 009				
工程名称		东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程														
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)		分项工程		透水面层		桩号(部位)		FZK0+700—FZK0+800						
施工单位		北京城建集团有限责任公司		项目经理		张晓伟		项目技术负责人		仇伟						
专业分包单位		/		专业分包项目经理		/		分包项目技术负责人		/						
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012														
质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录						监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求		第7.2.1条第1款		合格证、出厂检验报告齐全有效；进场复试合格						合格				
	2	结构层的透水性要求		第7.2.1条第2款		符合规范规定要求										
	3	透水砖的铺筑形式		第7.2.1条第3款		符合规范规定要求										
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定		第7.2.1条第4款		符合规范规定要求										
一般项目	1	透水砖铺砌质量		第7.2.2条第1款		平整、稳固，无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷，无翘动现象，灌缝饱满，缝隙一致						合格				
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量		第7.2.2条第2款		接顺，无反坡积水现象										
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	4	3	3	5	3	1	5					
			宽度(mm)	不小于设计规定	758	755	730	725	735	745	755					
			相邻块高差(mm)	≤2	2	2	1	1	1	0	1					
			横坡(%)	±0.3	-0.2	0.1	0.3	0	-0.2	-0.2	-0.3					
			道路中线偏位(mm)	≤20	2	14	9	16	14	2	5					
			纵缝直顺度(mm)	≤10	3	3	5	8	6	9	7					
			横缝直顺度(mm)	≤10	5	1	7	10	6	5	4					
			缝宽(mm)	±2	2	0	0	1	-1	0	1					
			井框与路面高差(mm)	≤3	1	3	3	1	3	0	3					
			高程(mm)	±20	-17	-18	19	11	17	13	13					
	各结构层厚度(mm)	±10	7	-2	-8	0	8	-6	-3							
	施工单位检查结果		主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求													
		专业工长: 葛志峰 项目专业质量检查员: 靳飞 2024年10月27日														
监理(建设)单位验收结论		验收合格														
		专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 韩杨 2024年10月27日														

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)										编号		05030201 010				
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程														
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)		分项工程		透水面层		桩号(部位)		FZK0+800--FZK0+900						
施工单位		北京城建集团有限责任公司		项目经理		张晓伟		项目技术负责人		仇伟						
专业分包单位		/		专业分包项目经理		/		分包项目技术负责人		/						
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012														
质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录						监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求		第7.2.1条第1款		合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格						合格				
	2	结构层的透水性要求		第7.2.1条第2款		符合规范规定要求										
	3	透水砖的铺筑形式		第7.2.1条第3款		符合规范规定要求										
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定		第7.2.1条第4款		符合规范规定要求										
一般项目	1	透水砖铺砌质量		第7.2.2条第1款		平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致						合格				
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量		第7.2.2条第2款		接顺,无反坡积水现象										
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	4	3	2	2	2	4	1					
			宽度(mm)	不小于设计规定	758	755	740	725	755	755	745					
			相邻块高差(mm)	≤2	0	0	2	0	1	2	2					
			横坡(%)	±0.3	0.1	-0.1	-0.3	0.3	0.2	-0.1	-0.2					
			道路中线偏位(mm)	≤20	2	1	9	5	19	5	3					
			纵缝直顺度(mm)	≤10	6	6	2	2	7	7	5					
			横缝直顺度(mm)	≤10	2	9	2	6	10	7	3					
			缝宽(mm)	±2	-2	1	1	0	0	-1	-1					
			井框与路面高差(mm)	≤3	0	1	3	2	2	1	1					
			高程(mm)	±20	2	-4	13	18	5	14	19					
	各结构层厚度(mm)	±10	-8	-1	-9	-6	-6	9	6							
	施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求													
		专业工长: 葛洪峰 项目专业质量检查员: 安欣 2024年10月28日														
监理(建设)单位验收结论		验收合格														
		专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 韩杨 2024年10月28日														

透水面层检验批质量验收记录 (表07-1-1)					编号	05030201 011									
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程													
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)	分项工程	透水面层	桩号(部位)	FZK0+900—FZK0+000									
施工单位		北京城建集团有限责任公司	项目经理	张晓伟	项目技术负责人	仇伟									
专业分包单位		/	专业分包项目经理	/	分包项目技术负责人	/									
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012													
质量验收规范的规定				施工单位检查评定记录				监理(建设)单位验收记录							
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求	第7.2.1条第1款	合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格						合格					
	2	结构层的透水性要求	第7.2.1条第2款	符合规范规定要求											
	3	透水砖的铺筑形式	第7.2.1条第3款	符合规范规定要求											
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定	第7.2.1条第4款	符合规范规定要求											
一般项目	1	透水砖铺砌质量	第7.2.2条第1款	平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致								合格			
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量	第7.2.2条第2款	接顺,无反坡积水现象											
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	4	4	1	3	0	3	3				
			宽度(mm)	不小于设计规定	758	755	730	735	755	745	745				
			相邻块高差(mm)	≤2	0	1	0	2	1	1	2				
			横坡(%)	±0.3	-0.3	0.2	-0.2	0	-0.2	0.2	-0.3				
			道路中线偏位(mm)	≤20	1	12	4	6	0	10	2				
			纵缝直顺度(mm)	≤10	1	4	7	2	9	8	7				
			横缝直顺度(mm)	≤10	3	8	4	8	5	7	9				
			缝宽(mm)	±2	1	2	-1	-1	-1	-2	1				
			井框与路面高差(mm)	≤3	0	2	2	2	3	3	1				
			高程(mm)	±20	9	-12	-17	17	8	15	16				
			各结构层厚度(mm)	±10	1	3	2	8	-2	1	-3				
			施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求										
		专业工长: 葛洪峰 项目专业质量检查员: 安彦 2024年10月29日													
监理(建设)单位验收结论		验收合格													
		专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 张勇 2024年10月29日													

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)					编号	05030201 012									
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程													
分部(子分部)工程	人行道(路面砖面层)	分项工程	透水面层	桩号(部位)	+FZK1+077.730、砖厂南街K0+000.00										
施工单位	北京城建集团有限责任公司	项目经理	张晓伟	项目技术负责人	仇伟										
专业分包单位	/	专业分包项目经理	/	分包项目技术负责人	/										
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012													
质量验收规范的规定			施工单位检查评定记录			监理(建设)单位验收记录									
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求	第7.2.1条第1款	合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格			合格								
	2	结构层的透水性要求	第7.2.1条第2款	符合规范规定要求											
	3	透水砖的铺筑形式	第7.2.1条第3款	符合规范规定要求											
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定	第7.2.1条第4款	符合规范规定要求											
一般项目	1	透水砖铺砌质量	第7.2.2条第1款	平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致			合格								
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量	第7.2.2条第2款	接顺,无反坡积水现象											
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	4	2		5	0	4	2	3			
			宽度(mm)	不小于设计规定	758	755		750	725	755	735	745			
			相邻块高差(mm)	≤2	1	0		1	2	1	2	2			
			横坡(%)	±0.3	-0.1	0		0	0.1	-0.1	-0.1	0			
			道路中线偏位(mm)	≤20	18	13		0	3	2	10	8			
			纵缝直顺度(mm)	≤10	8	7		6	4	1	4	9			
			横缝直顺度(mm)	≤10	4	8		2	6	5	3	9			
			缝宽(mm)	±2	2	-1		-1	0	1	-1	2			
			井框与路面高差(mm)	≤3	0	0		3	0	0	2	1			
			高程(mm)	±20	17	19		3	-4	-15	8	-20			
	各结构层厚度(mm)	±10	-8	-1	-4	-9		-7	-3	-6					
	施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 专业工长:葛东峰 项目专业质量检查员:张长 2024年11月01日												
监理(建设)单位验收结论		验收合格 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):韩杨 2024年11月01日													

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)										编号		05030201 013				
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程														
分部(子分部)工程		人行道(路面砖面层)		分项工程		透水面层		桩号(部位)		FZK0+45.488-FZK0+420						
施工单位		北京城建集团有限责任公司		项目经理		张晓伟		项目技术负责人		仇伟						
专业分包单位		/		专业分包项目经理		/		分包项目技术负责人		/						
执行标准名称及编号		《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012														
质量验收规范的规定						施工单位检查评定记录						监理(建设)单位验收记录				
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求		第7.2.1条第1款		合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格						合格				
	2	结构层的透水性要求		第7.2.1条第2款		符合规范规定要求										
	3	透水砖的铺筑形式		第7.2.1条第3款		符合规范规定要求										
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定		第7.2.1条第4款		符合规范规定要求										
一般项目	1	透水砖铺砌质量		第7.2.2条第1款		平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致						合格				
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量		第7.2.2条第2款		接顺,无反坡积水现象										
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	3	3	3	2	2	5	3					
			宽度(mm)	不小于设计规定	750	755	740	725	756	745	745					
			相邻块高差(mm)	≤2	1	1	1	1	2	1	1					
			横坡(%)	±0.3	0	0	0.2	0.1	-0.3	0.2	-0.1					
			道路中线偏位(mm)	≤20	3	20	13	14	12	19	19					
			纵缝直顺度(mm)	≤10	4	7	0	3	1	4	2					
			横缝直顺度(mm)	≤10	3	7	2	6	4	1	2					
			缝宽(mm)	±2	-1	-2	1	-1	-1	0	1					
			井框与路面高差(mm)	≤3	3	3	2	1	0	2	2					
			高程(mm)	±20	-1	6	-10	-17	-7	14	-14					
			各结构层厚度(mm)	±10	-5	-2	-6	2	-6	2	5					
施工单位检查结果		主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求														
		专业工长: 葛东峰 项目专业质量检查员: 刘彦飞 2024年12月09日														
监理(建设)单位验收结论		验收合格 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 李杨 2024年12月09日														

透水面层检验批质量验收记录 (表C7-1-1)					编号	05030201 014									
工程名称		东六环西侧路(张采路-土桥中街)道路工程													
分部(子分部)工程	人行道(路面砖面层)	分项工程	透水面层	桩号(部位)	FYK0+49.834-FYK0+460										
施工单位	北京城建集团有限责任公司	项目经理	张晓伟	项目技术负责人	仇伟										
专业分包单位	/	专业分包项目经理	/	分包项目技术负责人	/										
执行标准名称及编号	《透水砖路面技术规程》CJ/T 188-2012														
质量验收规范的规定			施工单位检查评定记录		监理(建设)单位验收记录										
主控项目	1	透水砖的透水性能等要求	第7.2.1条第1款	合格证、出厂检验报告齐全有效;进场复试合格		合格									
	2	结构层的透水性要求	第7.2.1条第2款	符合规范要求											
	3	透水砖的铺筑形式	第7.2.1条第3款	符合规范要求											
	4	品种、级别、质量、包装、储存等规定	第7.2.1条第4款	符合规范要求											
一般项目	1	透水砖铺砌质量	第7.2.2条第1款	平整、稳固,无污染、空鼓、掉角及断裂等外观缺陷,无翘动现象,灌缝饱满,缝隙一致		合格									
	2	透水砖面层与路缘石及其他构筑物质量	第7.2.2条第2款	接顺,无反坡积水现象											
	3	透水砖铺装允许偏差	表面平整度(mm)	≤5	1		4	4	1	3	1	4			
			宽度(mm)	不小于设计规定	753		755	750	725	755	735	745			
			相邻块高差(mm)	≤2	2		0	0	2	1	1	2			
			横坡(%)	±0.3	-0.1		0.1	0	0.2	0.2	-0.2	-0.1			
			道路中线偏位(mm)	≤20	3		19	16	15	19	14	16			
			纵缝直顺度(mm)	≤10	3		9	9	3	3	7	3			
			横缝直顺度(mm)	≤10	9		7	1	10	7	1	6			
			缝宽(mm)	±2	-1		0	-1	1	0	0	-1			
			井框与路面高差(mm)	≤3	2		2	1	2	3	3	3			
			高程(mm)	±20	-9		5	6	-4	-4	-16	-9			
			各结构层厚度(mm)	±10	-3		6	10	-2	1	4	3			

施工单位检查结果	主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求	
	专业工长: 郑兴峰	项目专业质量检查员: 安志 2024年12月09日
监理(建设)单位验收结论	验收合格	
	专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 韩杨	2024年12月09日

透水面层		分项工程质量验收记录		编号	050302
(表C7-2)					
单位（子单位）工程名称		道路工程			
分部（子分部）工程名称		人行道(路面砖面层)			
分项工程名称		透水面层		检验批数量	14
施工单位		北京城建集团有限责任公司			
项目经理		张晓伟		项目技术负责人	仇伟
专业分包单位		/			
专业分包项目经理		/		专业分包技术负责人	/
序号	检验批部位、区段	施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收意见	
1	FYK0+523.925--FYK0+700	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
2	FYK0+700--FYK0+800	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
3	FYK0+800--FYK0+900	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
4	FYK0+900--FYK1+000	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
5	FYK1+000--FYK1+100	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
6	FYK1+100--FYK1+174.702	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
7	FZK0+479.383--FZK0+620	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
8	FZK0+620--FZK0+700	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
9	FZK0+700--FZK0+800	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
10	FZK0+800--FZK0+900	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
11	FZK0+900--FZK0+000	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
12	FZK1+000--FZK1+077.730、砖厂南街K0+000.00-K065.62	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
13	FZK0+45.488-FZK0+420	主控项目全部合格，一般项目满足规范要求		验收合格	
备注：					
施工单位检查评定结果		符合质量验收规范要求			
		项目专业质量（技术）负责人		仇伟	2024年12月09日
监理（建设）单位验收结论		同意验收			
		专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）		韩杨	2024年12月09日

本表由施工单位填写。

透水面层			分项工程质量验收记录		编号	050302
(表C7-2)						
单位（子单位）工程名称		道路工程				
分部（子分部）工程名称		人行道（路面砖面层）				
分项工程名称		透水面层		检验批数量	14	
施工单位		北京城建集团有限责任公司				
项目经理		张晓伟	项目技术负责人	仇伟		
专业分包单位		/				
专业分包项目经理		/	专业分包技术负责人	/		
序号	检验批部位、区段		施工单位检查评定结果		监理（建设）单位验收意见	
14	FYK0+49.834-FYK0+460		主控项目全部合格，一般项目满足规范规定要求		验收合格	
备注：						
施工单位 检查评定结果		符合质量验收规范要求				
		项目专业质量（技术）负责人		仇伟	2024年12月09日	
监理（建设）单位 验收结论		同意验收				
		专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）		韩杨	2024年12月09日	

本表由施工单位填写。




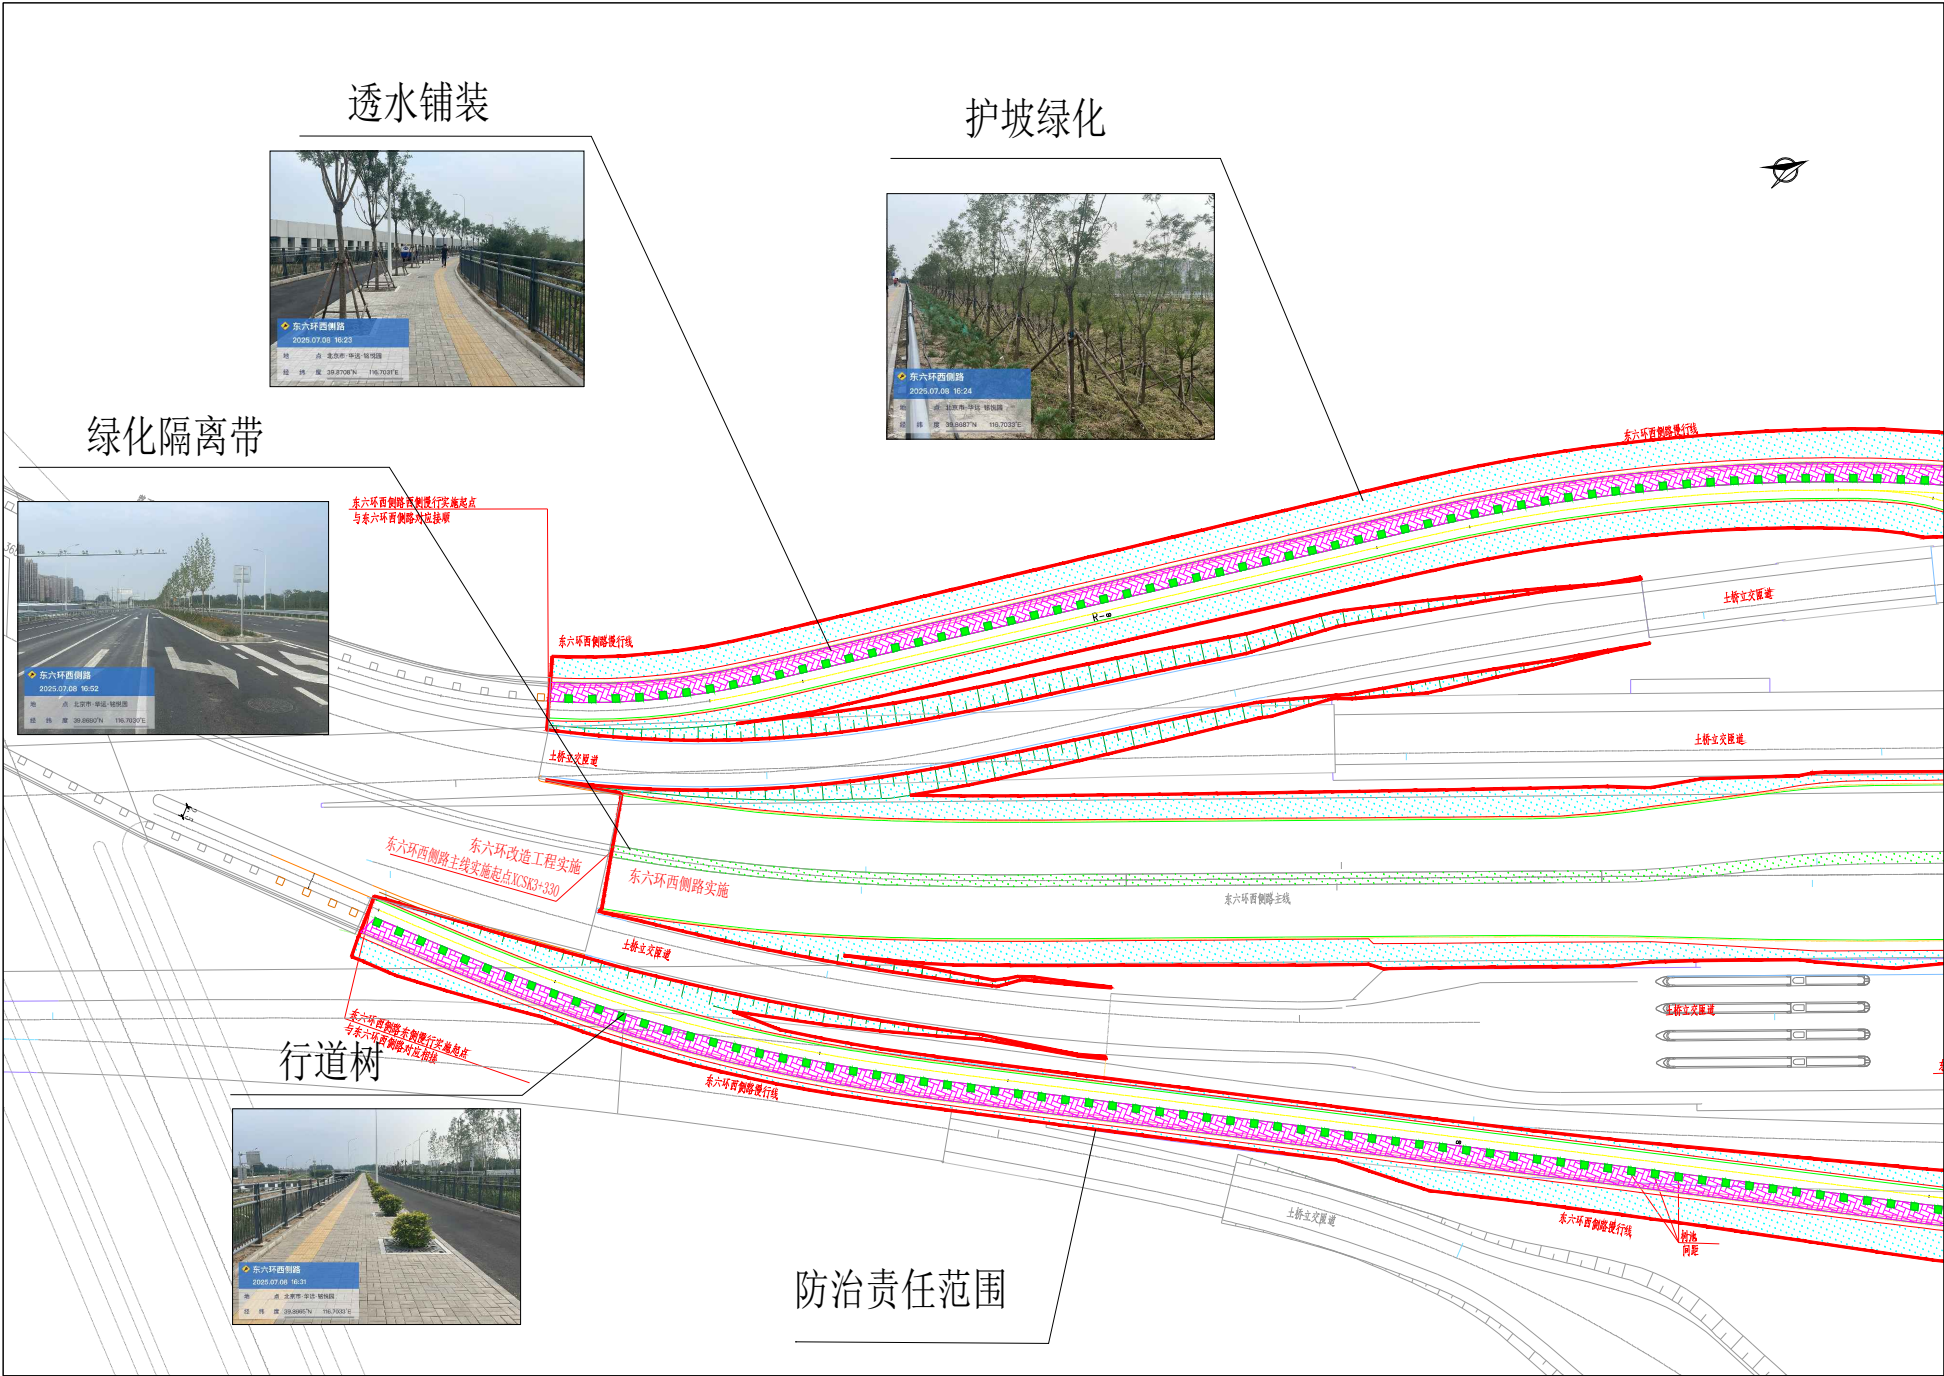


图 例

- 项目建设区（防治责任范围）
- 行道树
- 透水铺装
- 绿化隔离带
- 边坡绿化

水土保持措施量汇总表				
防治分区		措施名称	单位	实际实施量
工程措施	道路工程防治区	透水铺装	hm ²	0.81
		整理绿化用地	hm ²	0.45
植物措施	道路工程防治区	绿化隔离带	hm ²	0.45
		边坡绿化	hm ²	2.67

北京安睿捷科技有限公司						
核定 审查		东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程		竣工	验收	
				水保	部分	
校核		水土保持设施竣工验收图				
设计						
制图						
描图						
资质	水土保持方案	比例	1:500	日期	2025.07	
证号	水保监测（京）字第20230020号		图号	附图1-1		

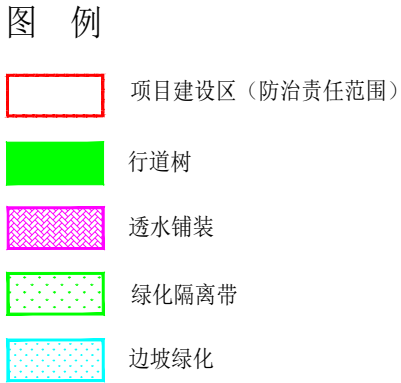
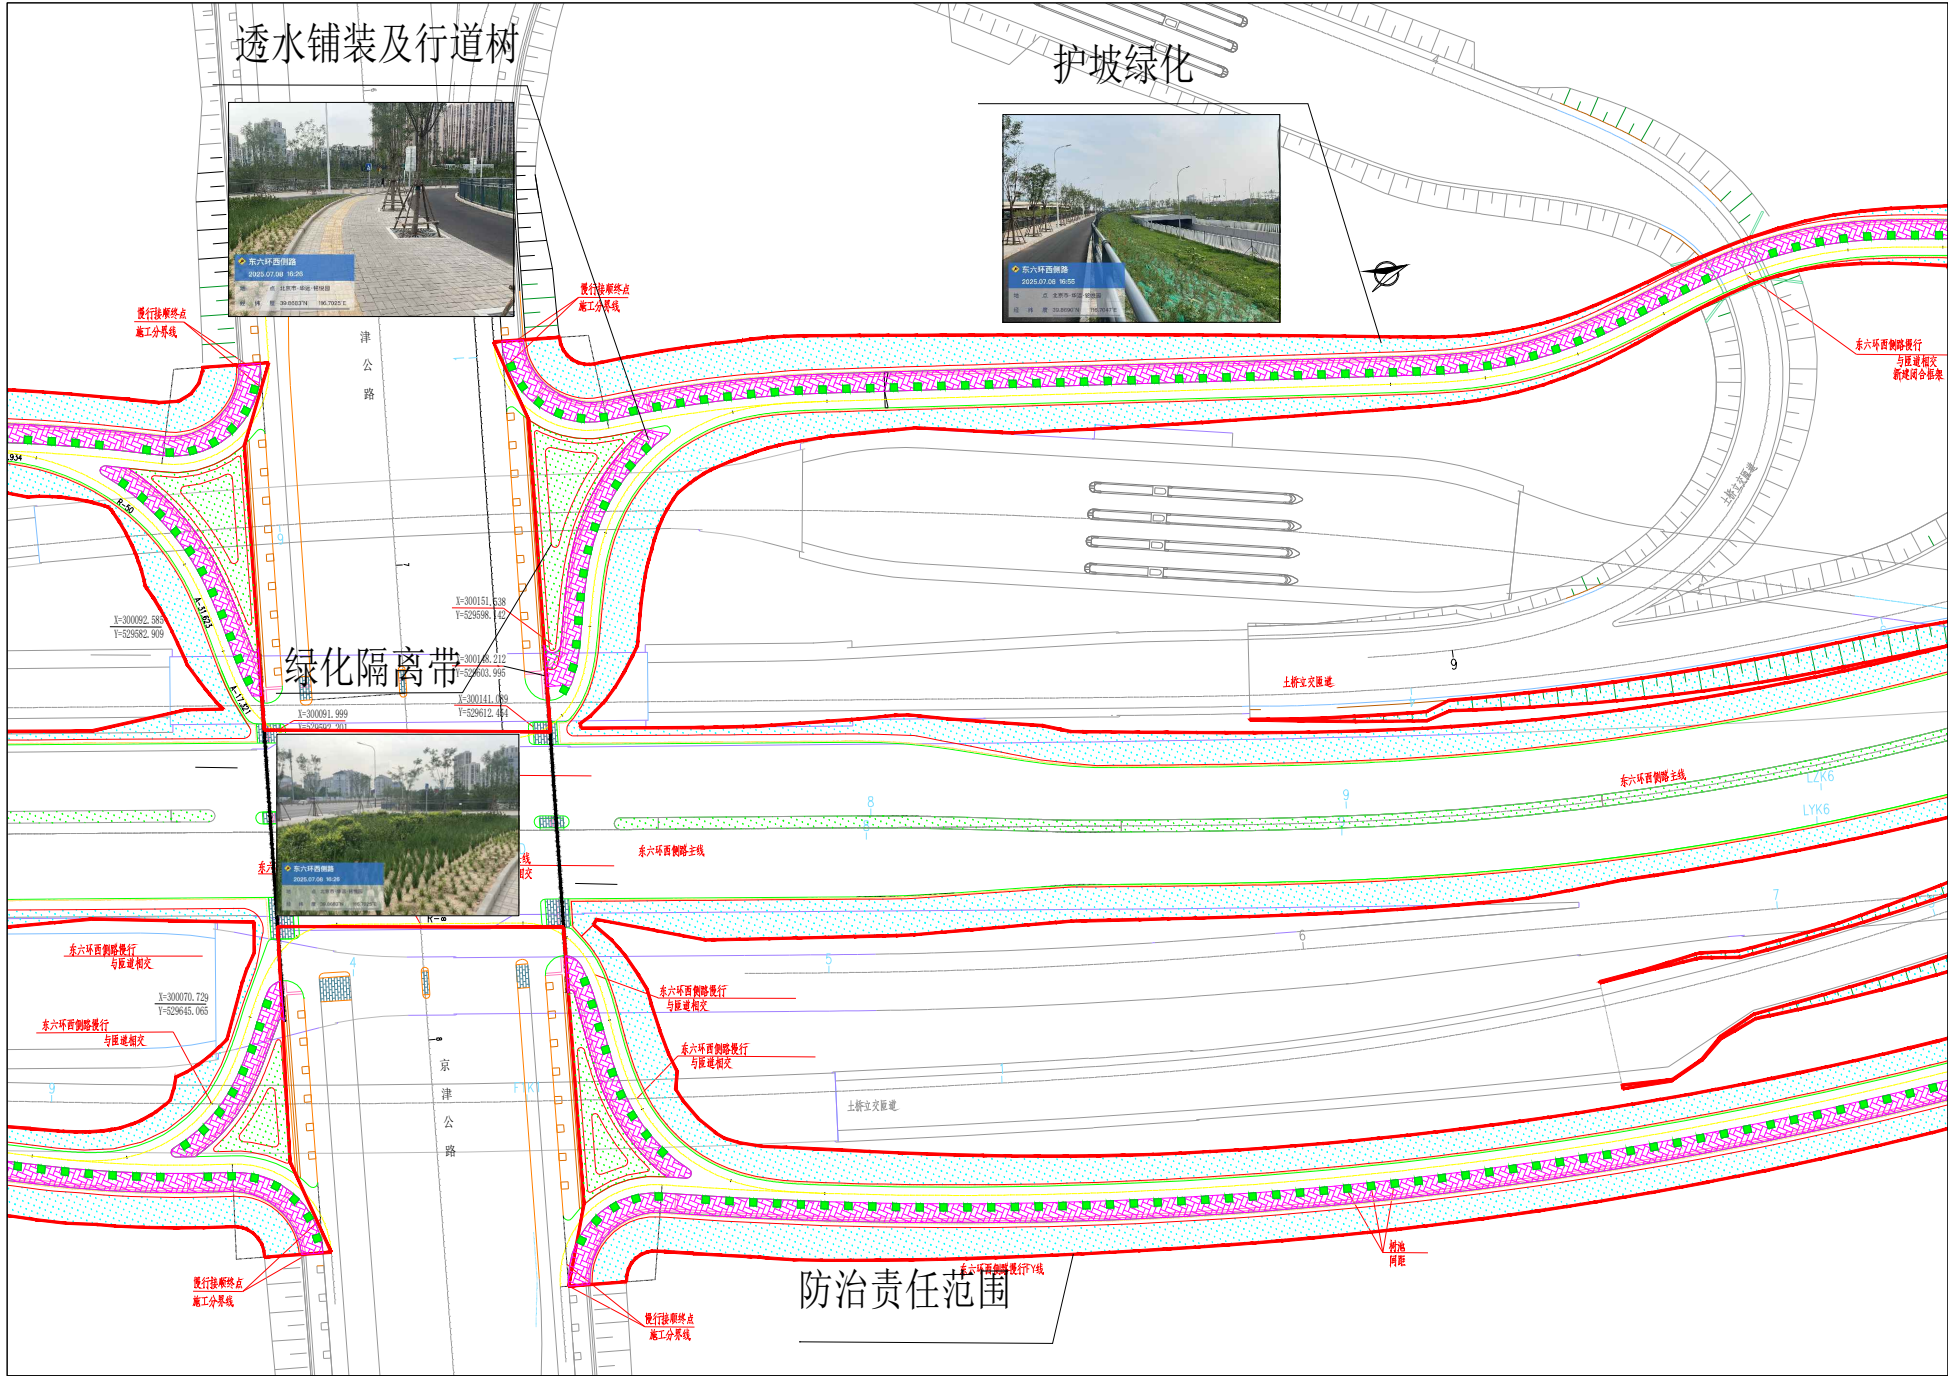


水土保持措施量汇总表


防治分区	措施名称	单位	实际实施量
工程措施	道路工程防治区	透水铺装	0.81
	整理绿化用地	0.45	
植物措施	道路工程防治区	绿化隔离带	0.45
	边坡绿化	2.67	

北京安睿捷科技有限公司

核定		东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程			竣工	验收
审查					水保	部分
校核		水土保持设施竣工验收图				
设计						
制图						
描图						
资质	水土保持方案	比例	1:500	日期	2025.07	
证号	水保监测（京）字第20230020号	图号	附图1-2			

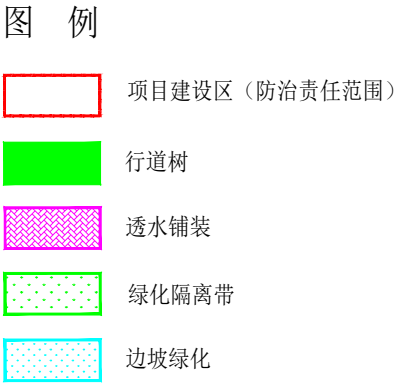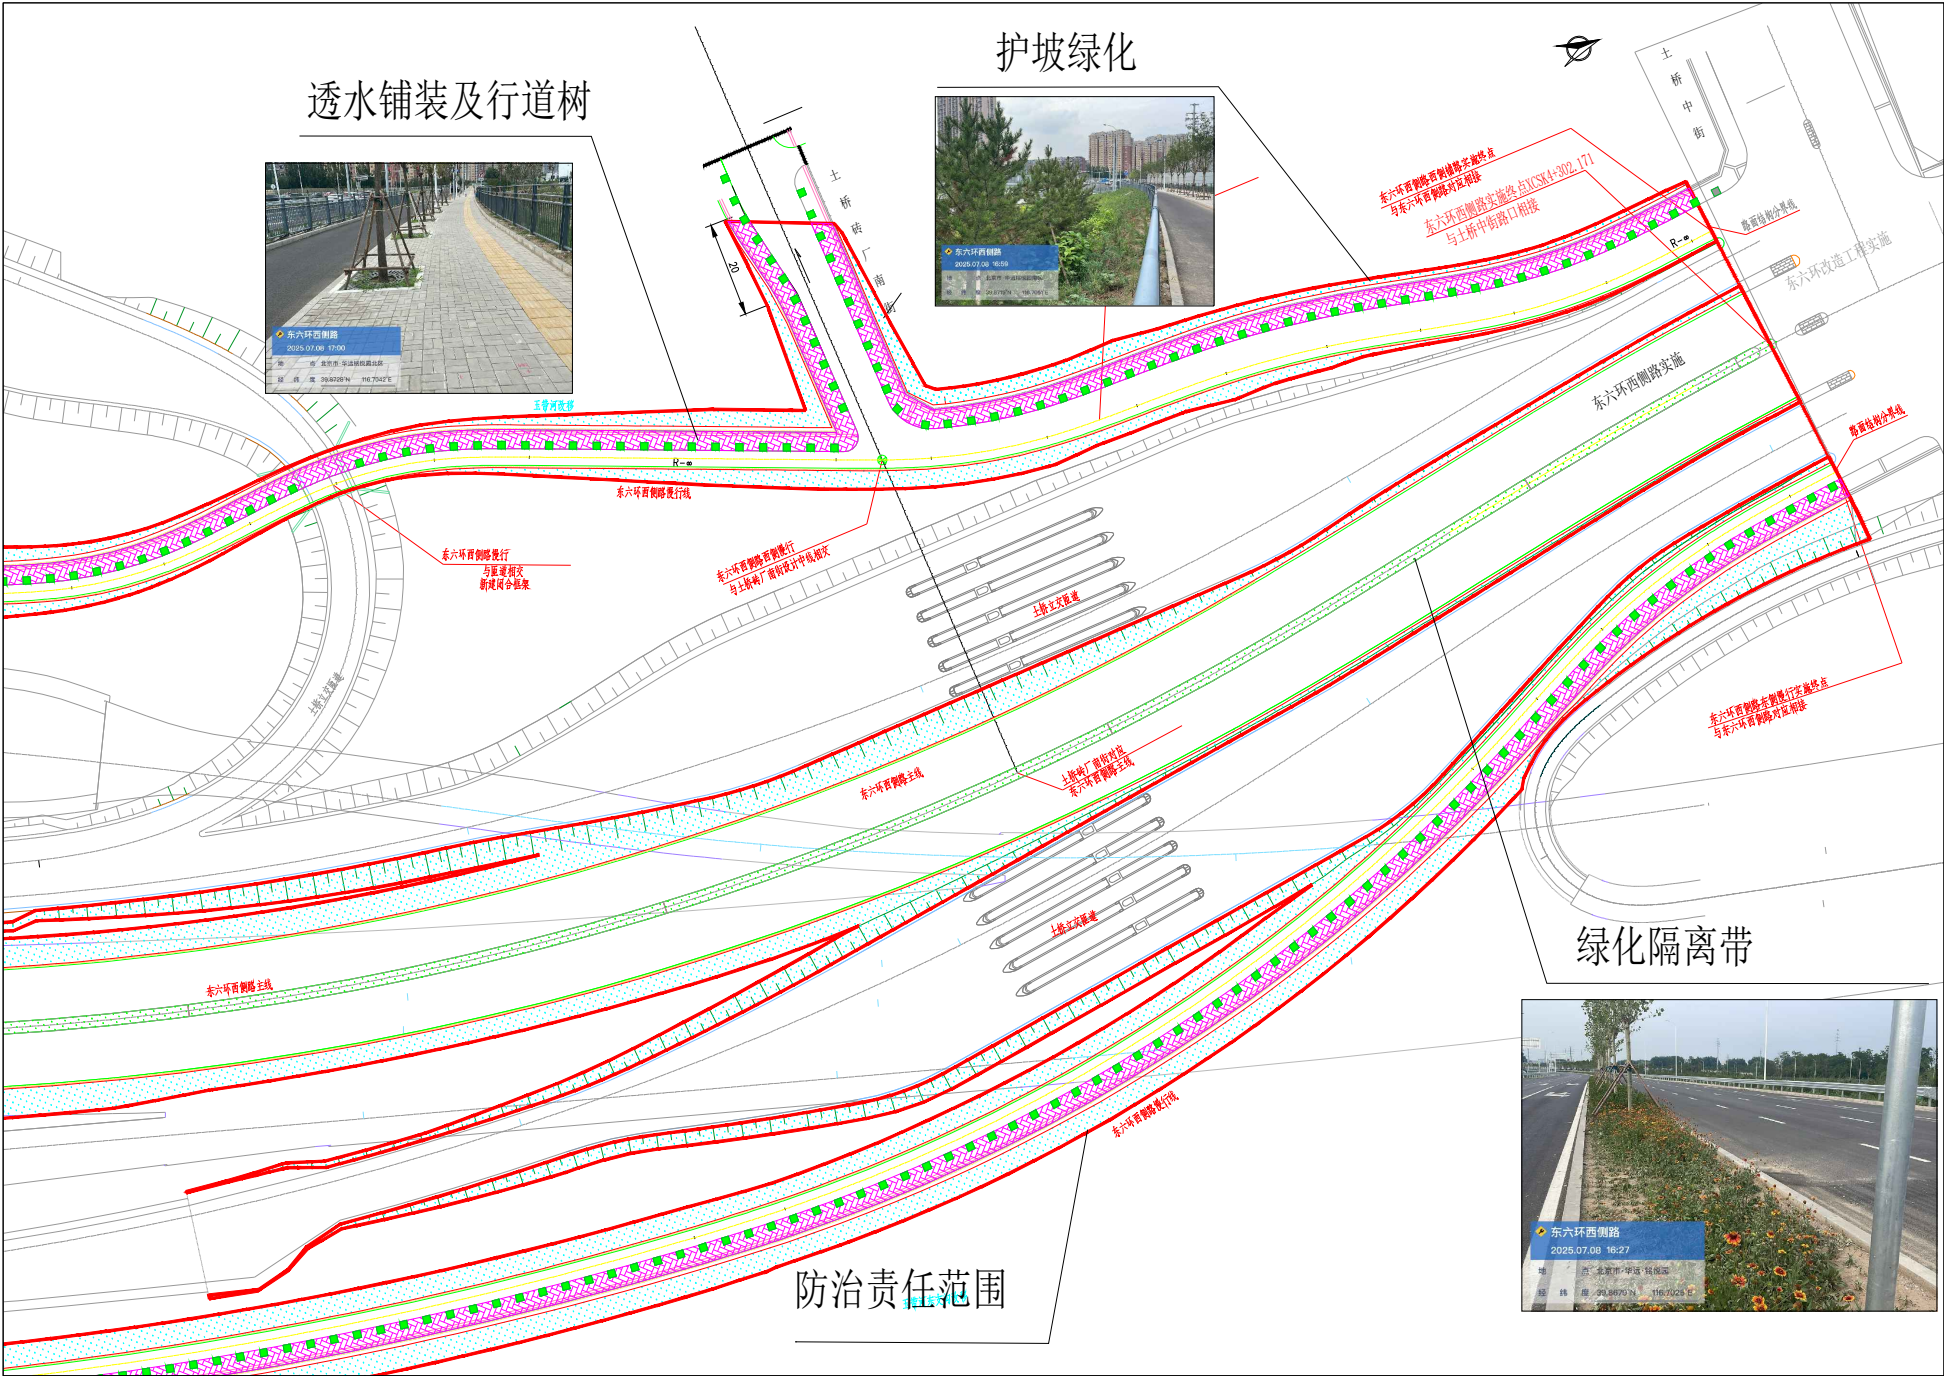

水土保持措施量汇总表				
防治分区		措施名称	单位	实际实施量
工程措施	道路工程防治区	透水铺装	hm ²	0.81
		整理绿化用地	hm ²	0.45
植物措施	道路工程防治区	绿化隔离带	hm ²	0.45
		边坡绿化	hm ²	2.67

北京安睿捷科技有限公司						
核定		东六环西侧路（张采路-土桥中街）道路工程	竣工		验收	
审查			水保		部分	
校核		水土保持设施竣工验收图				
设计						
制图						
描图						
资质	水土保持方案	比例	1:500	日期	2025.07	
证号	水保监测（京）字第20230020号		图号	附图1-3		
